




Engenharia e Obras Ceará




Avanço Execução das Obras – Novas Conexões


Atendimento - Grupo A + Grupo B :

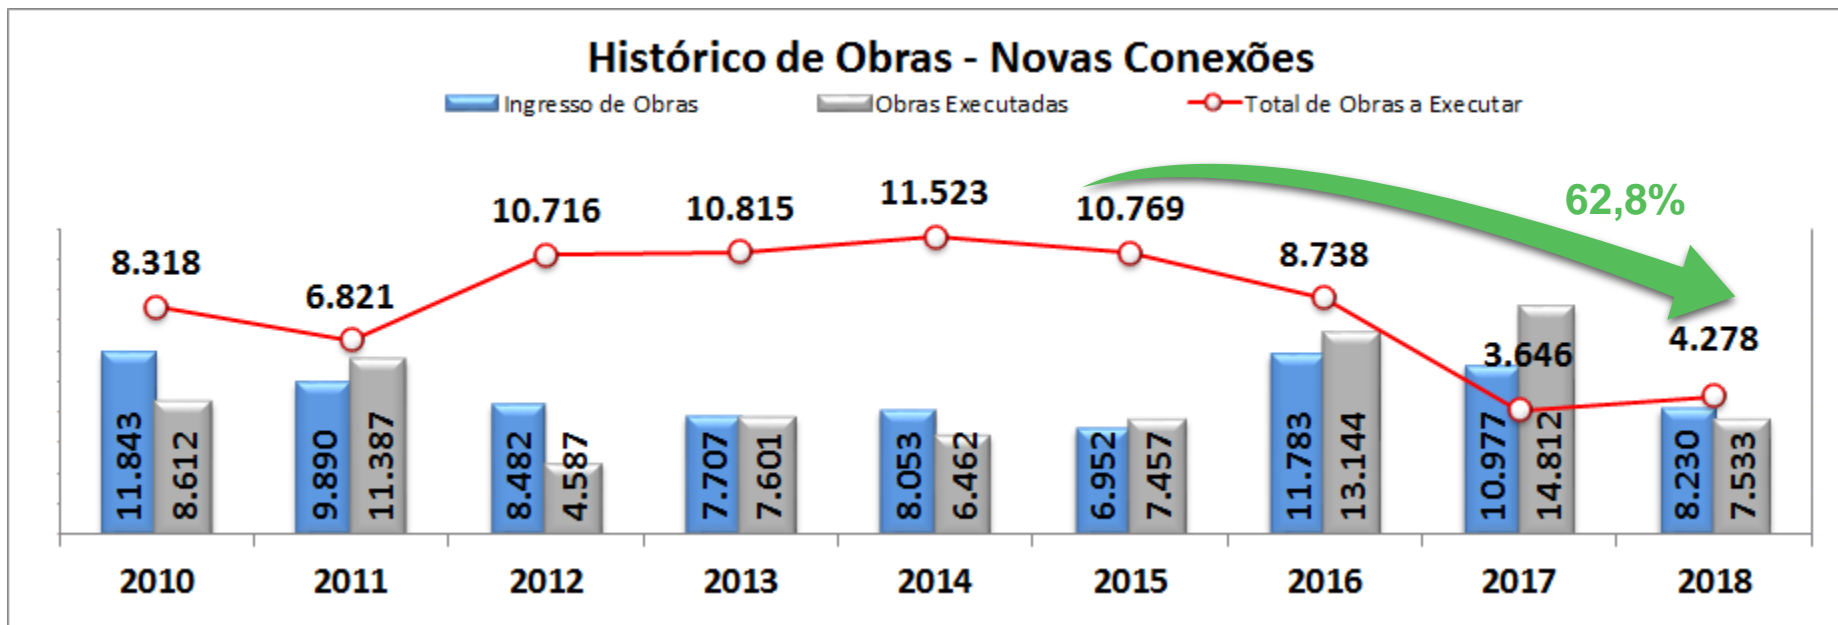

Previsão de Ingresso - Novas Conexões

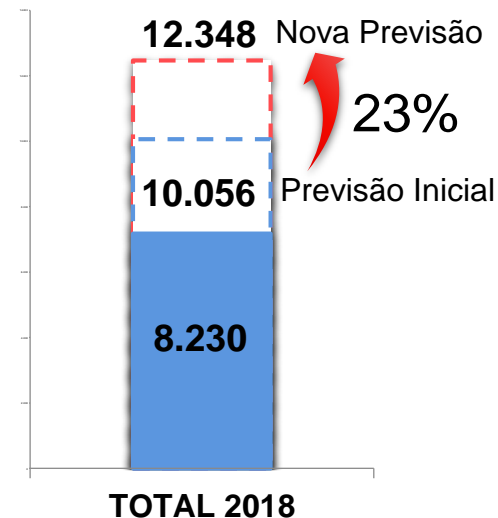

* Valor acumulado até agosto de 2018

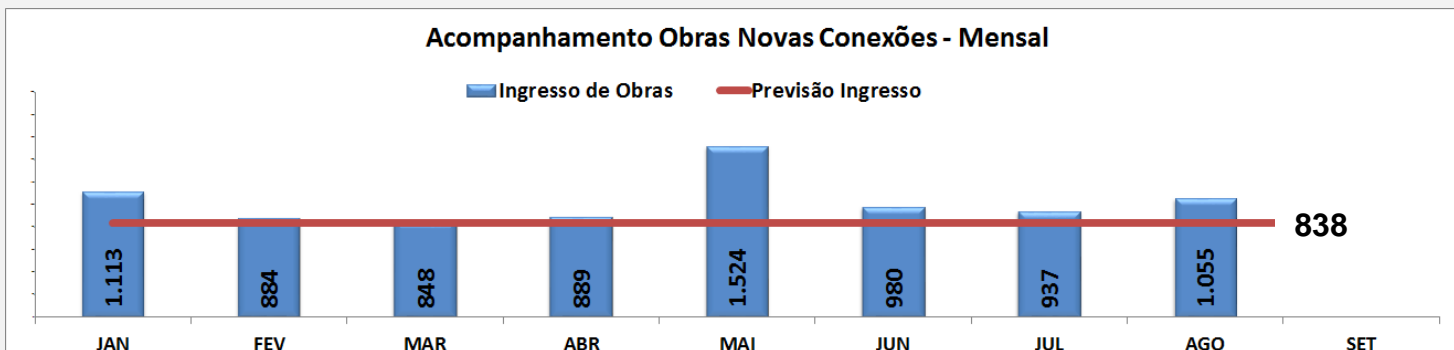

Pontos Relevantes


- Forte ingresso de novas solicitações até Agosto, estamos **23% acima da previsão inicial**. Passamos de 838 obras/ mês para **1.029 obras/mês**.
- Turmas alocadas em obras de grande porte até o 3T (Para a revisão tarifária).



Evolução da Execução de Obras - Fluxo

Período: Maio de 2016 até 31/08/2018


Obras 2016 a Julho 2018 + Backlog

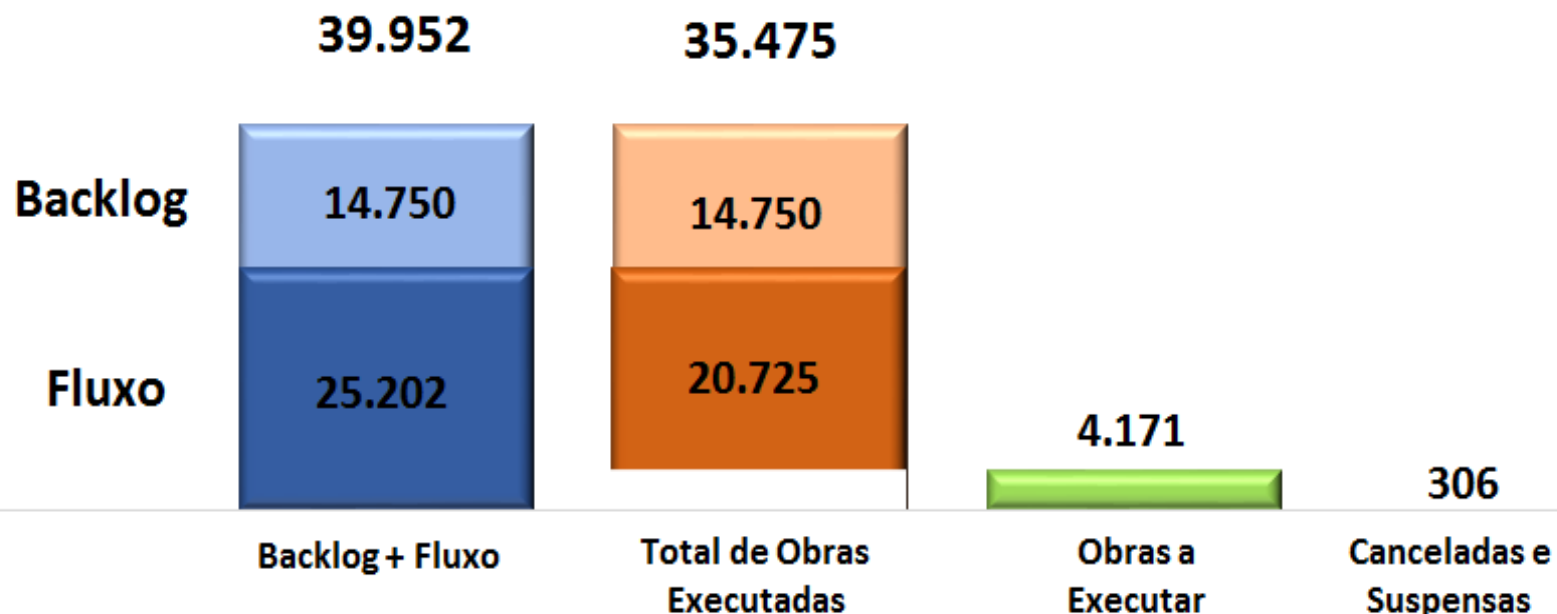

Obras Fluxo - Executadas x A executar



Obras a Executar - Prazo x Fora Prazo

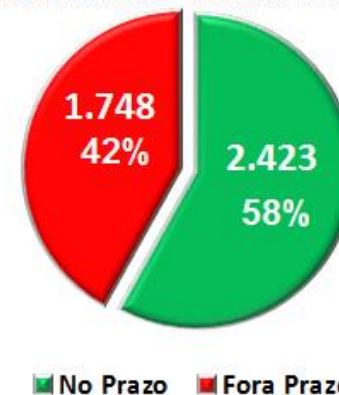


Novas Conexões – Acompanhamento Plano de Obras



Plano de Melhoria ARCE – Execução de Obras


Objetivo: Atingir o indicador das obras de Novos Clientes com o percentual de 95% dentro do prazo regulatório.

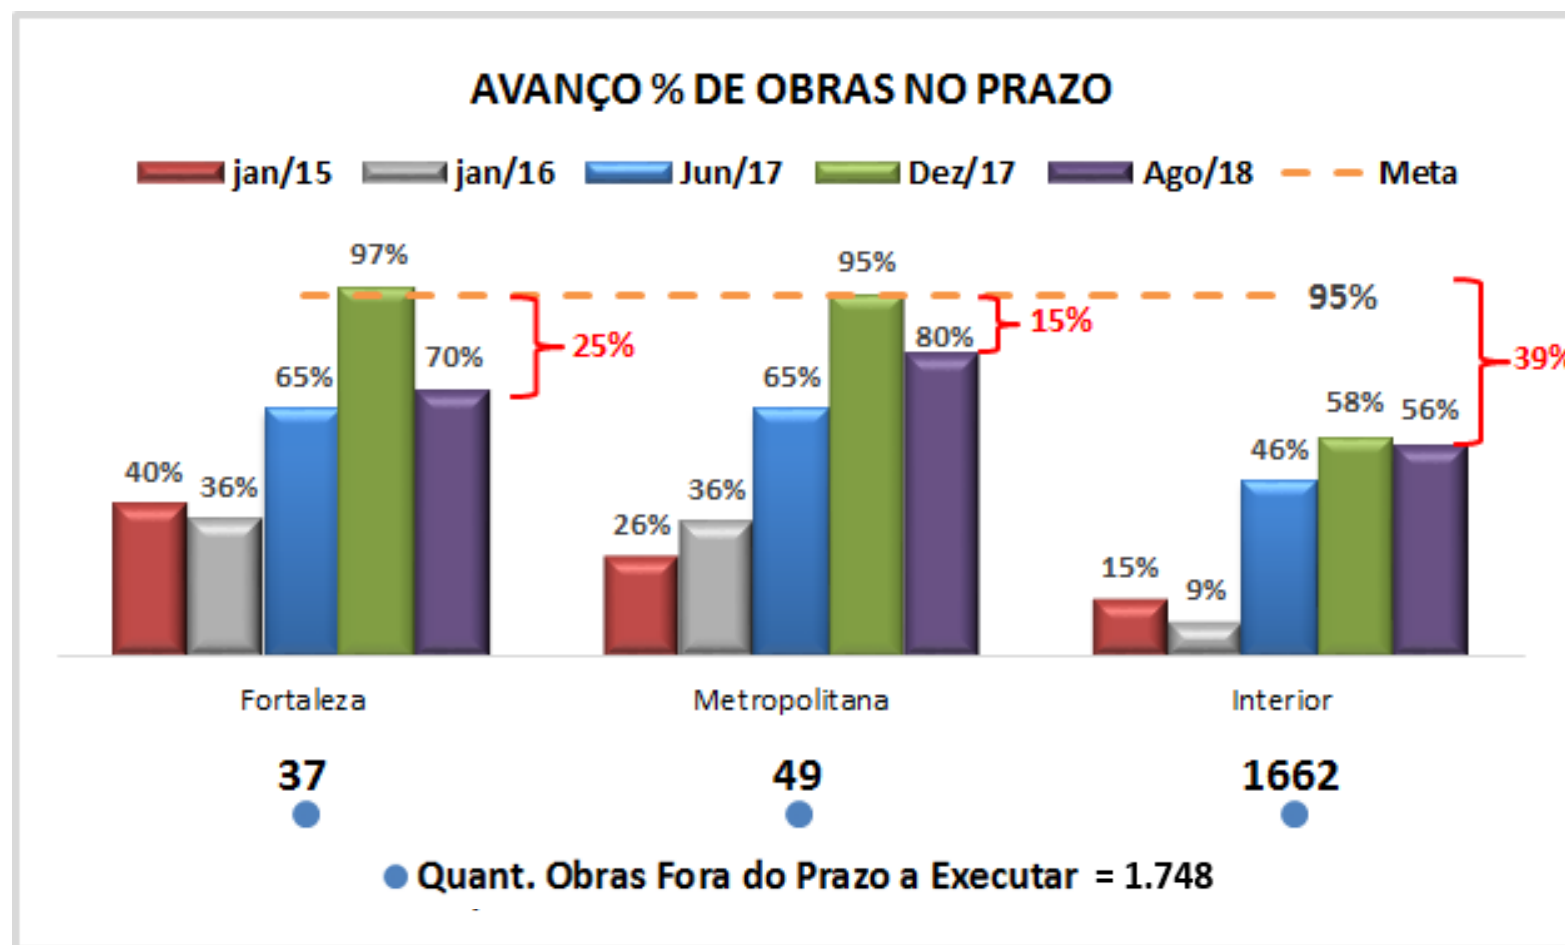

Plano de Ação

Iniciativas para recuperação do prazo de obras

Resultado das ações anteriores

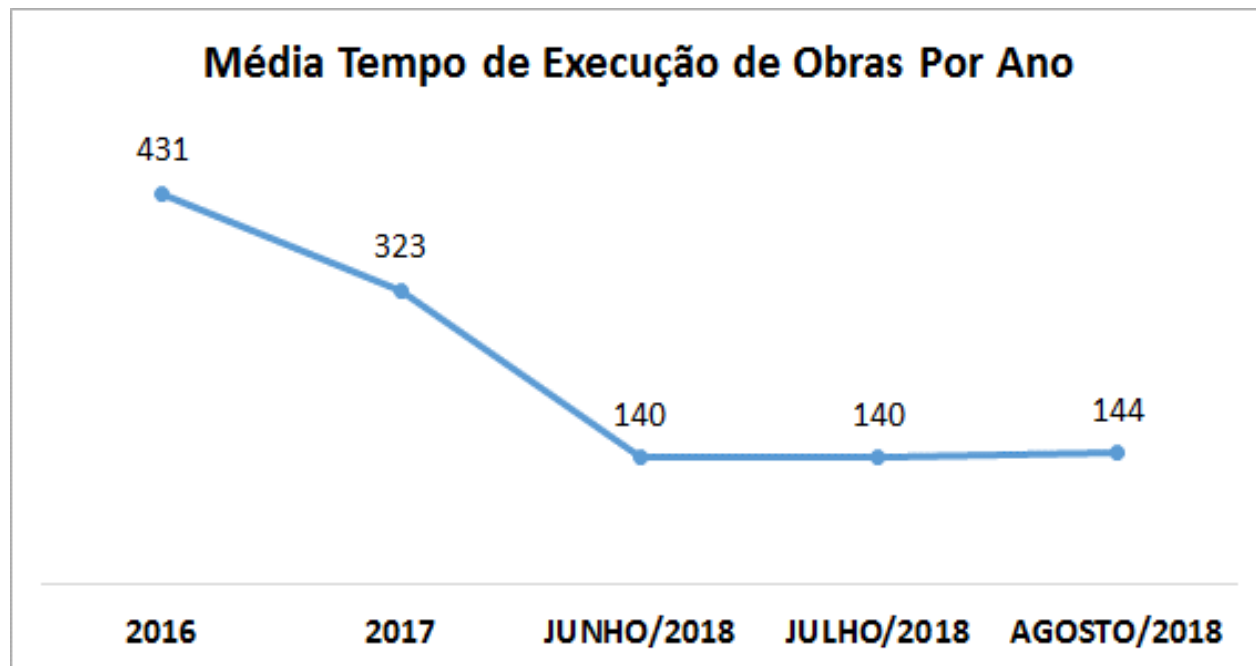

Novas Ações

Para atingir 95% das obras no prazo

Incremento de turmas (+10 turmas):

- 02 Turmas CENEGED – Entrada Julho /18 ✓
- 01 Turma CENEGED – Previsão Agosto/18 ✓
- 02 Turmas LION – Entrada Julho /18 ✓
- 01 Turma LION – Previsão Agosto/18
- 02 Turmas CCELP – Entrada Julho /18 ✓
- 02 Turmas CCELP – Previsão Agosto /18 ✓

Aumentar a produtividade das turmas de construção em 20%

- Reunião com Fornecedores de Construção
- Incremento de Turmas de inicialização de Obras


Histórico – Mobilização das Turmas de Construção

2017 e 2018



Mobilização Turmas de Construção

Turmas Mobilizadas em Campo Previsão de Mobilização

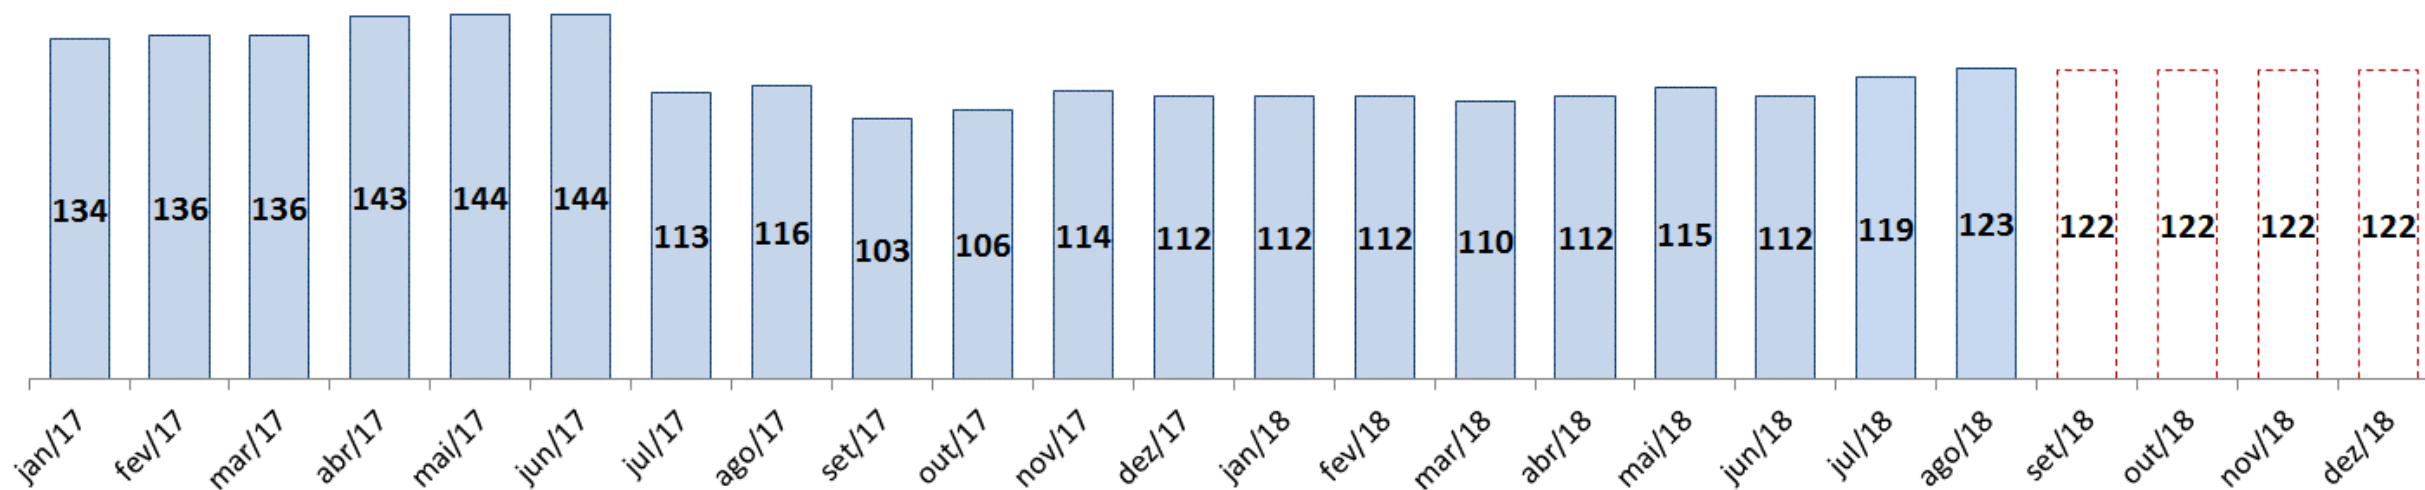



Obrigado

