



---


# Engenharia e Obras Ceará

---




# Avanço Execução das Obras – Novas Conexões

Atendimento - Grupo A + Grupo B :

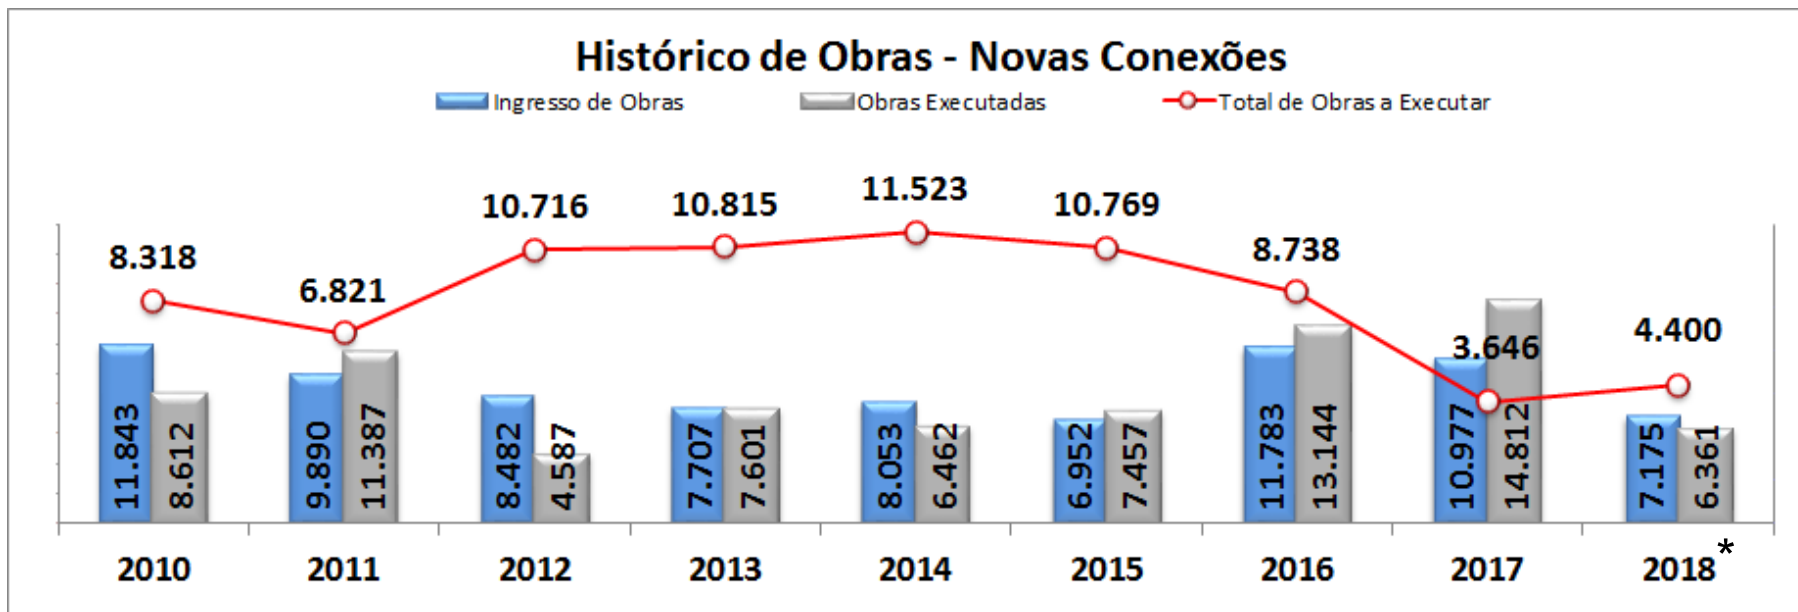


\* Valor acumulado até junho de 2018

Previsão de Ingresso - Novas Conexões

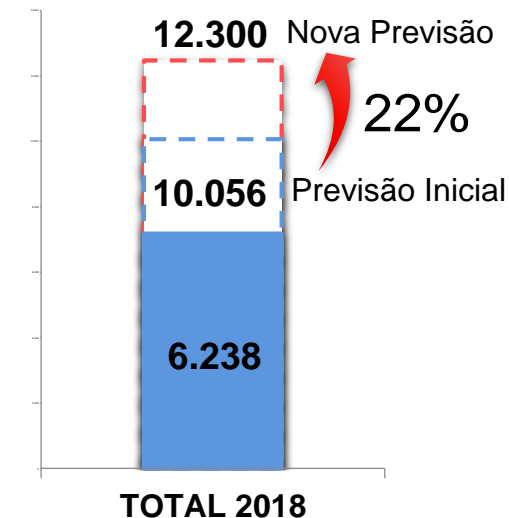

Acompanhamento Obras Novas Conexões - Mensal

Ingresso de Obras (blue bars), Previsão Ingresso (red line)

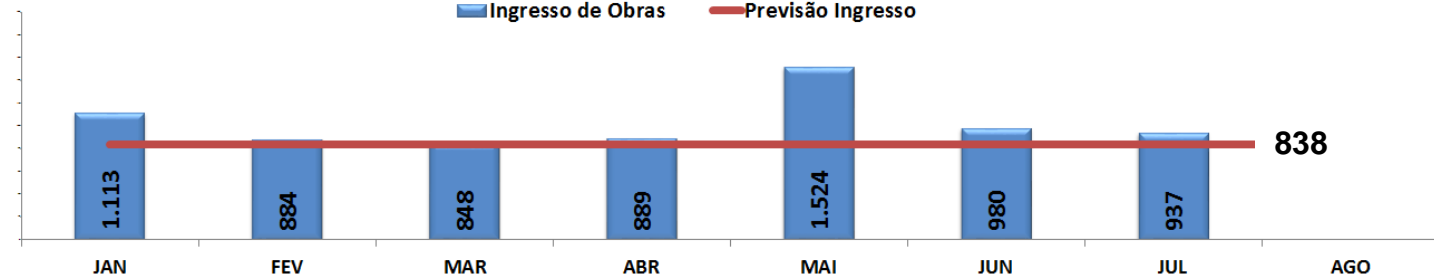

## Pontos Relevantes


Forte ingresso de novas solicitações até Julho, estamos **22% acima da previsão** inicial. Passamos de 838 obras/ mês para **1.025 obras/mês**.



# Evolução da Execução de Obras - Fluxo

Período: Maio de 2016 até 31/07/2018


Obras 2016 a Julho 2018 + Backlog

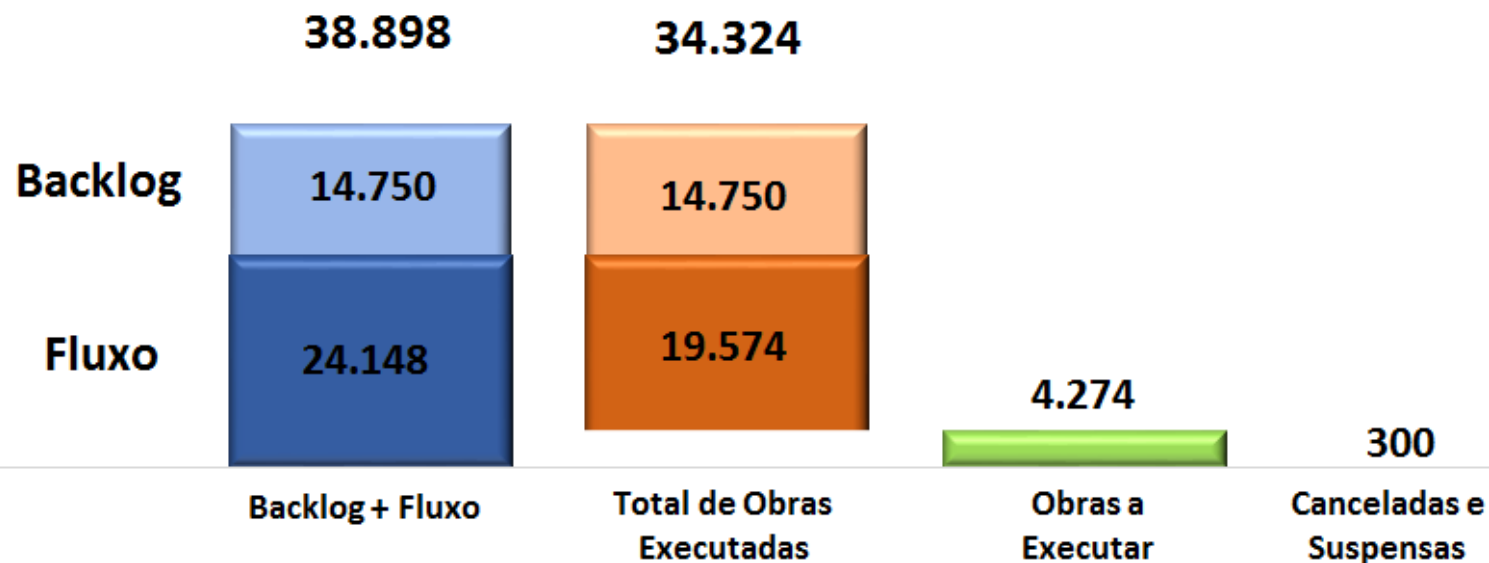

Obras Fluxo - Executadas x A executar



Obras a Executar - Prazo x Fora Prazo

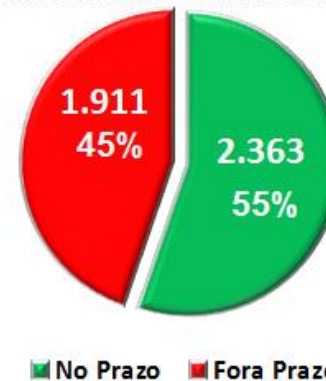


### Item 3: Novas Conexões – Acompanhamento Plano de Obras

Plano de Melhoria ARCE – Execução de Obras




**Objetivo:** Atingir o indicador das obras de Novos Clientes com o percentual de 95% dentro do prazo regulatório.

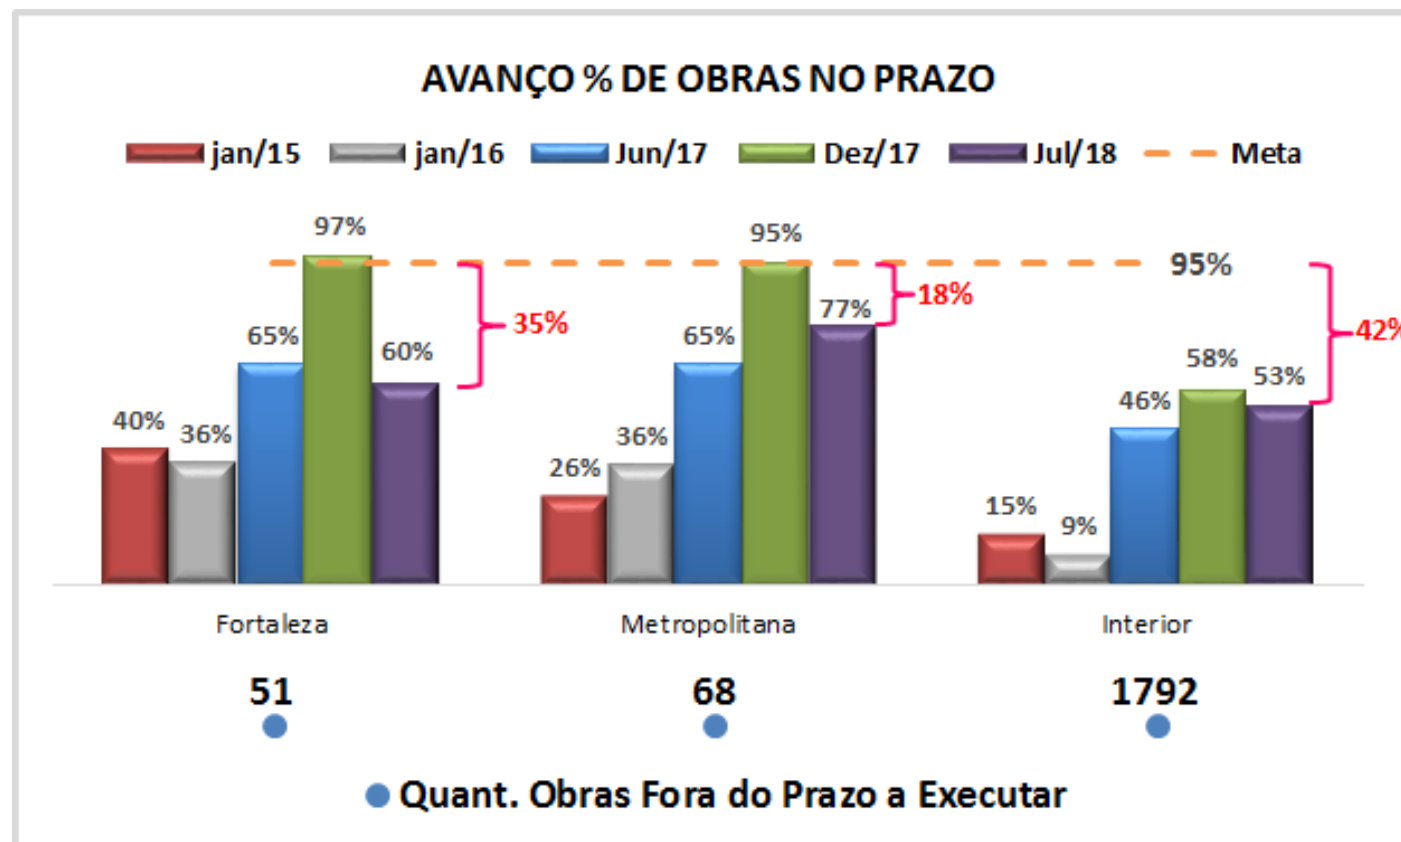

# Plano de Ação

Iniciativas para recuperação do prazo de obras

Resultado das ações anteriores

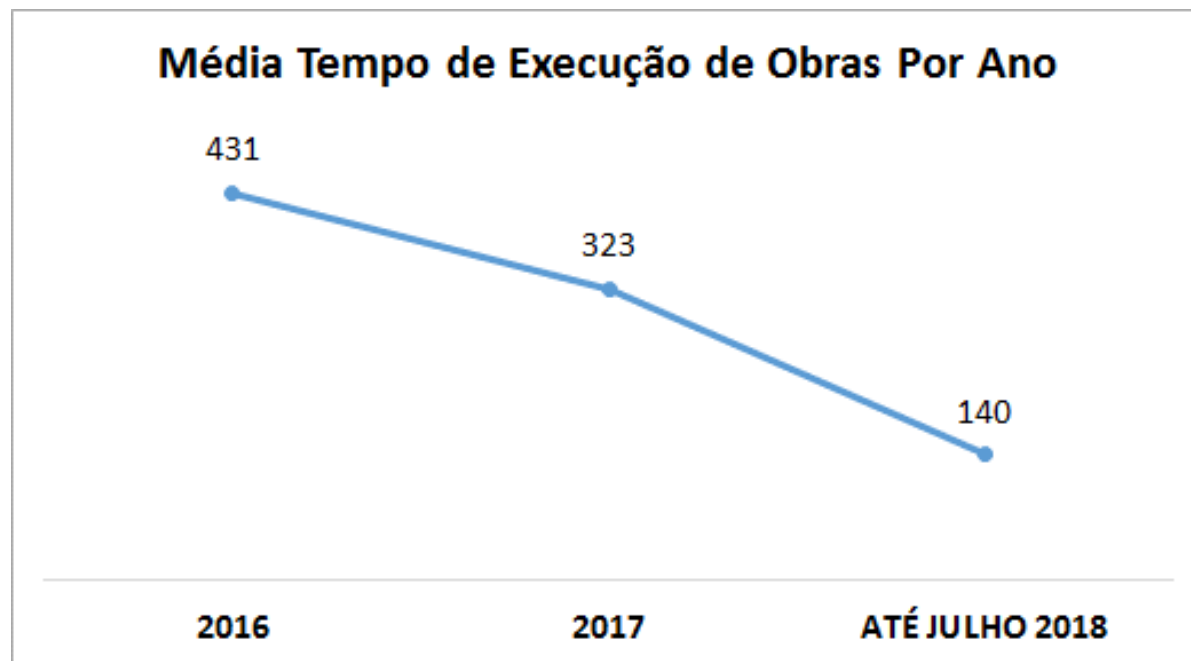

## Novas Ações

Para atingir 95% das obras no prazo

### Incremento de turmas (+10 turmas):


- 02 Turmas CENEGED – Entrada Julho /18 ✓
- 01 Turma CENEGED – Previsão Agosto/18 ✓
- 02 Turmas LION – Entrada Julho /18 ✓
- 01 Turma LION – Previsão Agosto/18
- 02 Turmas CCELP – Entrada Julho /18 ✓
- 02 Turmas CCELP – Previsão Agosto /18

### Aumentar a produtividade das turmas de construção em 20%

- Reunião com Fornecedores de Construção
- Incremento de Turmas de inicialização de Obras

# Histórico – Mobilização das Turmas de Construção

2017 e 2018

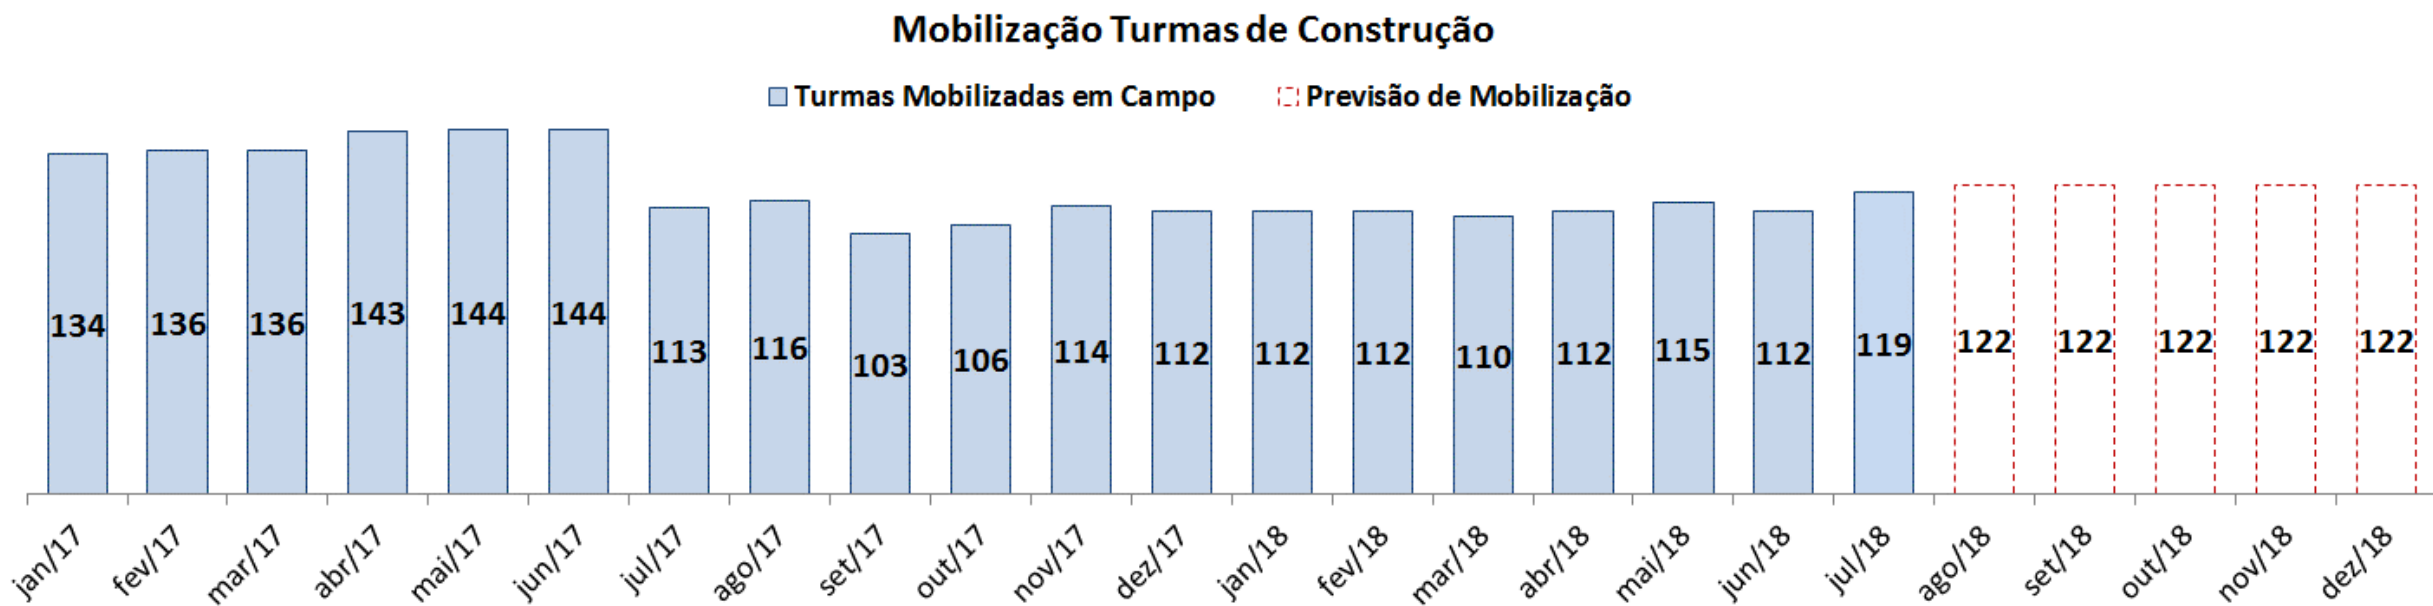



# Obrigado

