



---

# Engenharia e Obras Ceará


---

# Evolução da Execução Obras – De maio de 2016 até 31/08/2020




Avanço Execução das Obras Cientes

Obras até 31 de agosto 2020 + Backlog

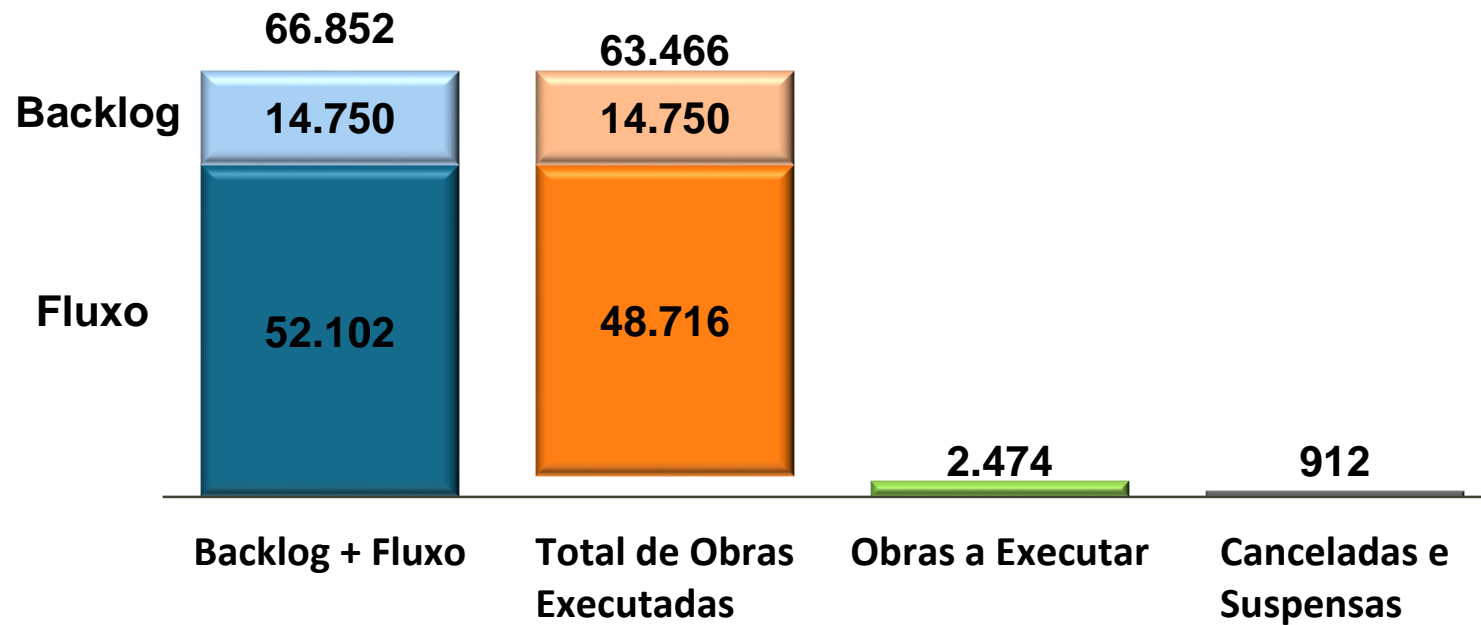

Obras Fluxo Executadas x A executar

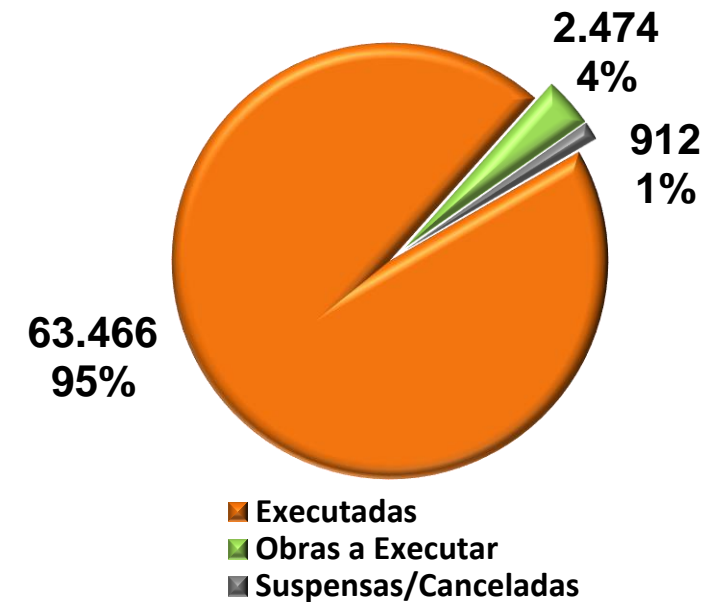


# Histórico de Execução de Obras - 2010 a 2020

Avanço Execução das Obras



## Histórico de Obras - Novas Conexões

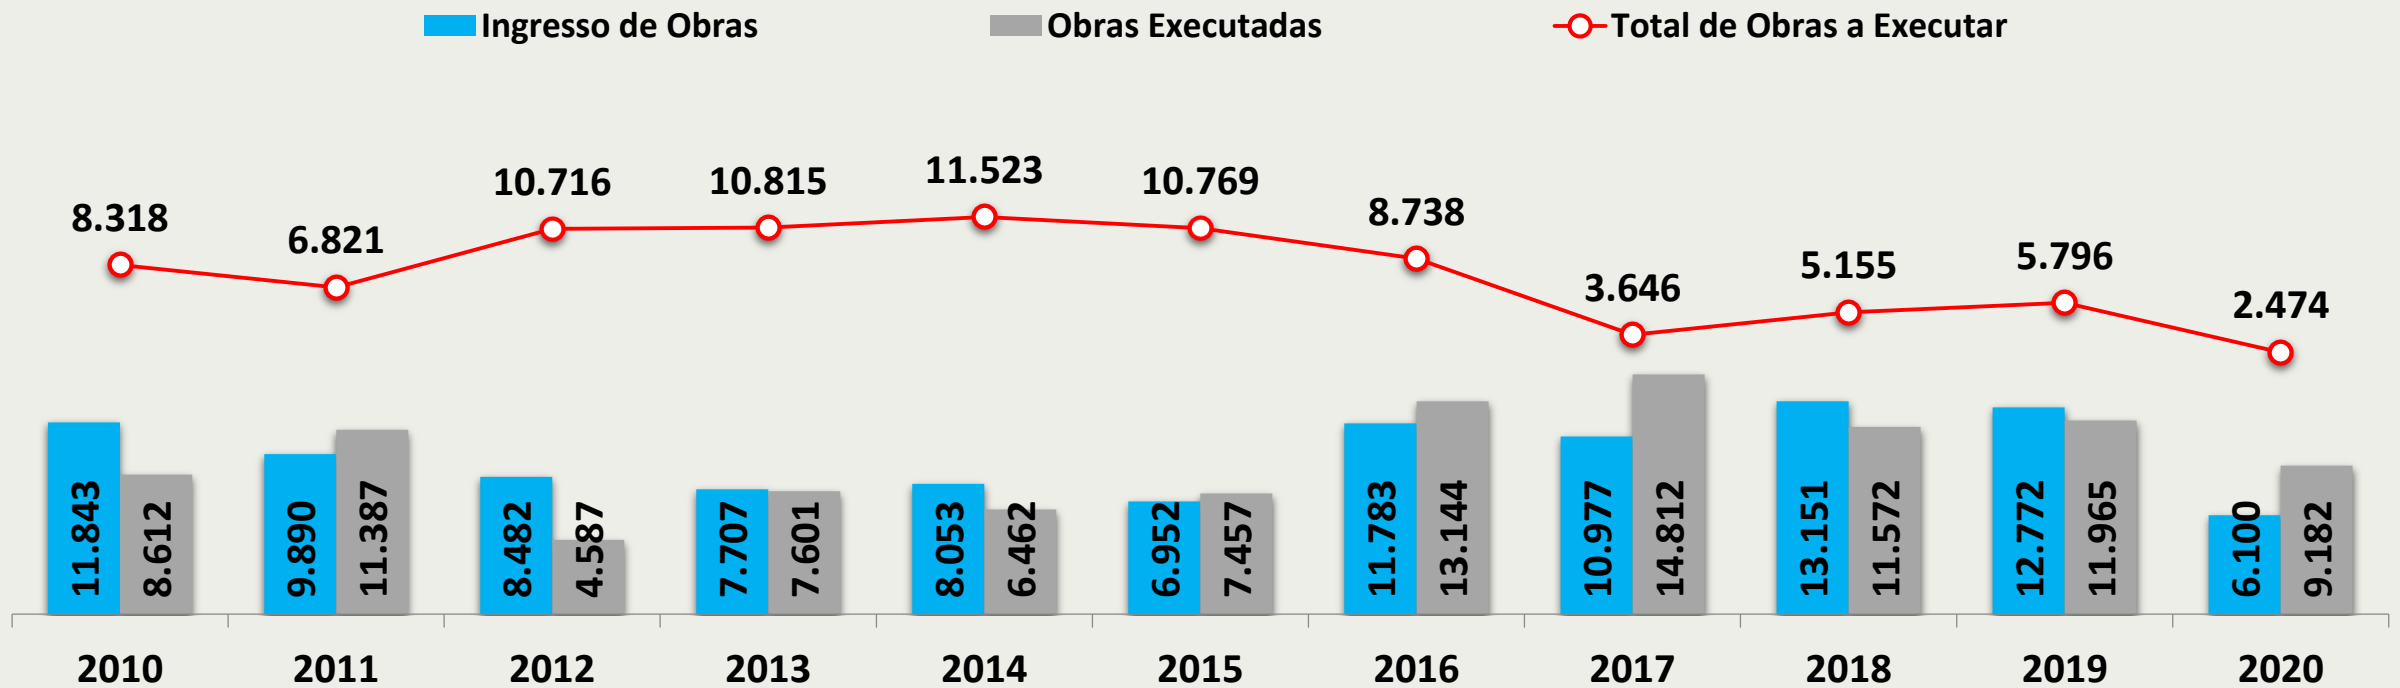





# Evolução da Execução e Estoque de Obras

Avanço Execução e Estoque das Obras Clientes


## Acompanhamento Obras Executadas - Mensal

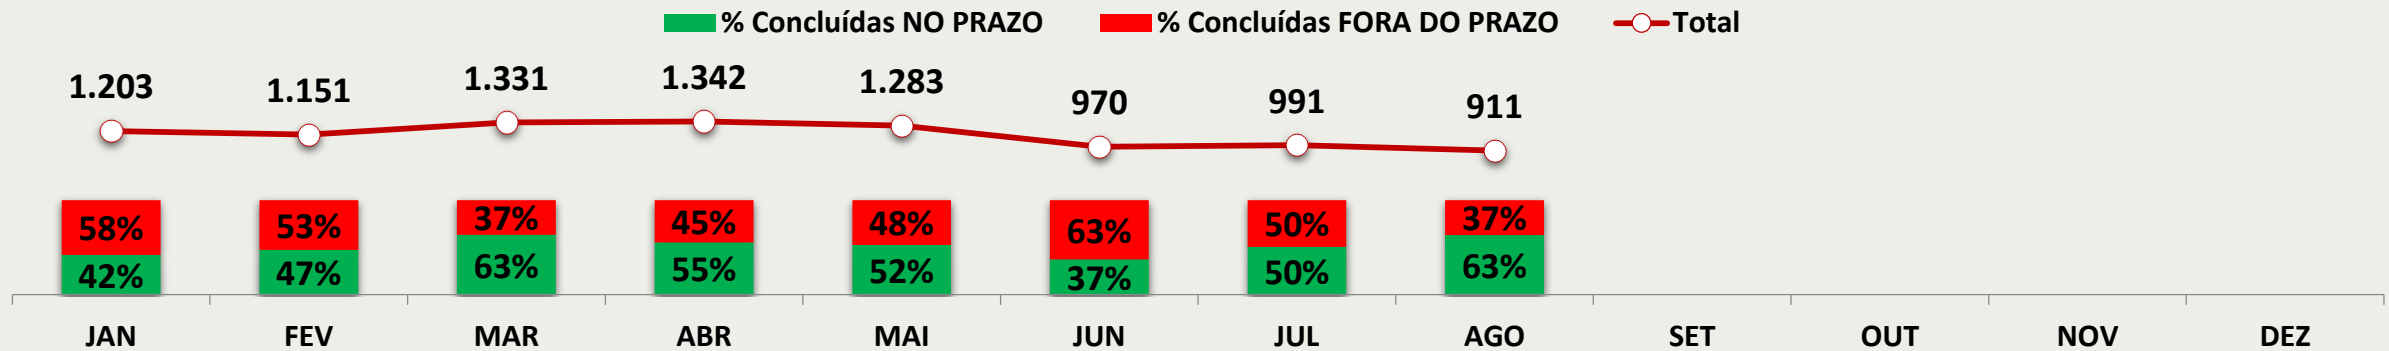

## Acompanhamento Estoque Novas Conexões - Mensal

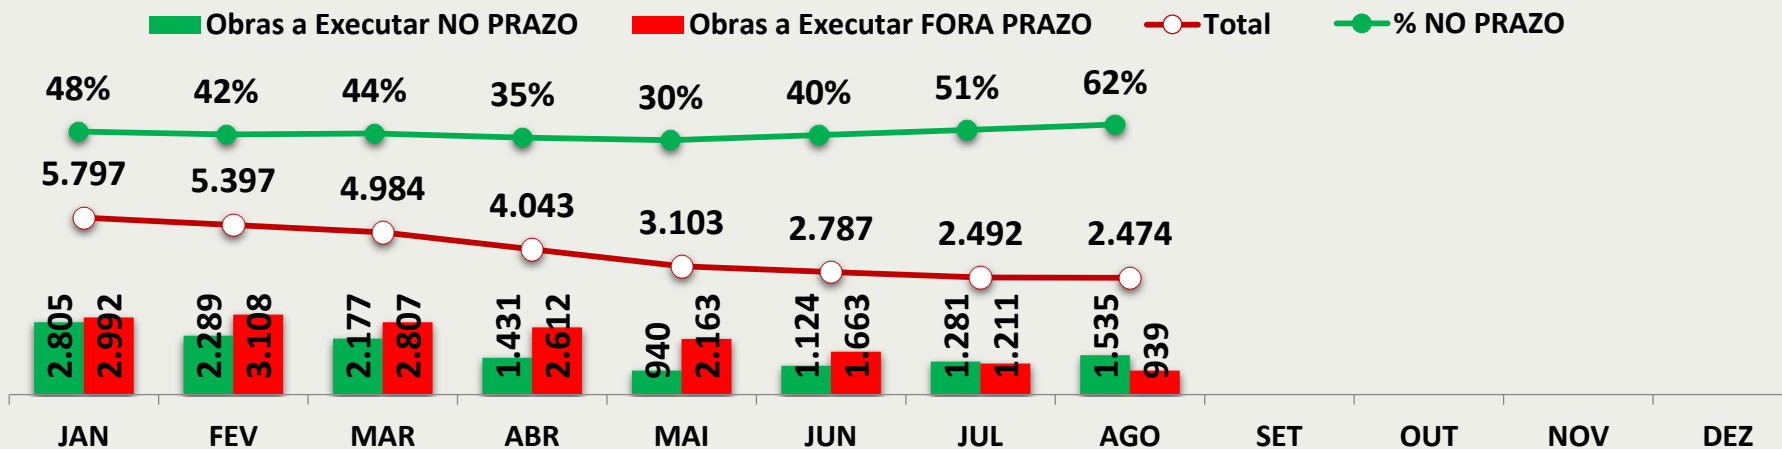

## Obras em Estoque Prazo x Fora Prazo

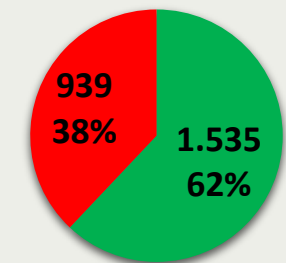

Estoque de Obras: 2.474




# Evolução da Execução Obras

## Avanço Execução das Obras Cientes


### Acompanhamento Estoque Novas Conexões – Por Regional

■ % NO PRAZO ■ % FORA PRAZO

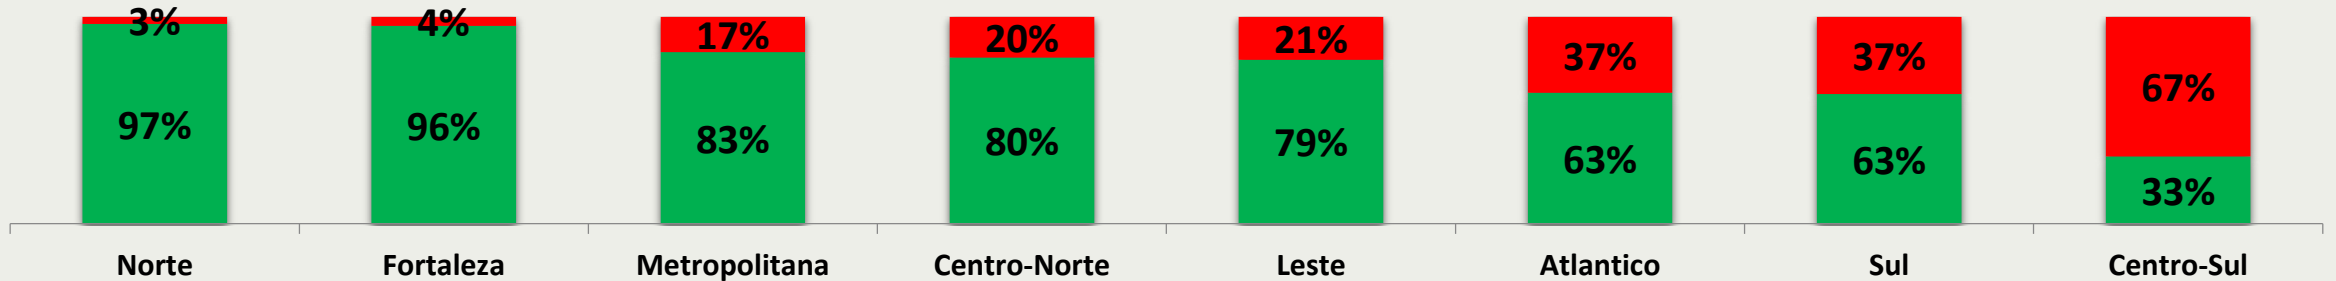

### Acompanhamento Estoque Novas Conexões - Por Regional

■ Obras a Executar NO PRAZO ■ Obras a Executar FORA PRAZO ○ Total

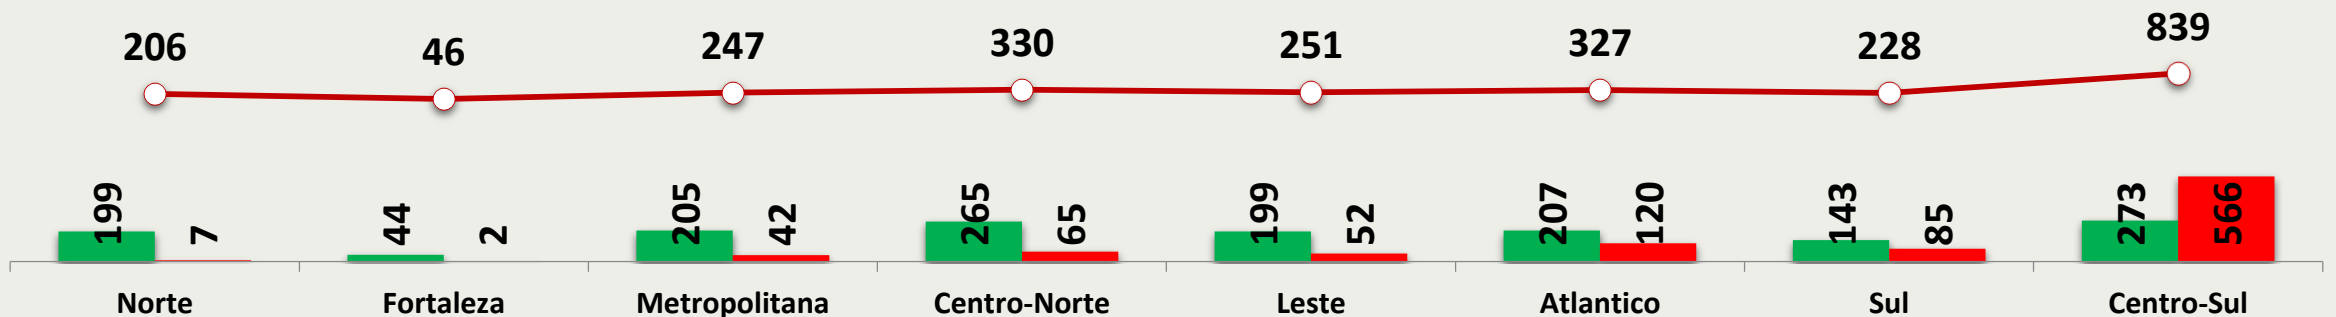





# Evolução da Execução Obras

## Avanço Execução das Obras Cientes

### Acompanhamento Estoque Novas Conexões Mensal Grupo A

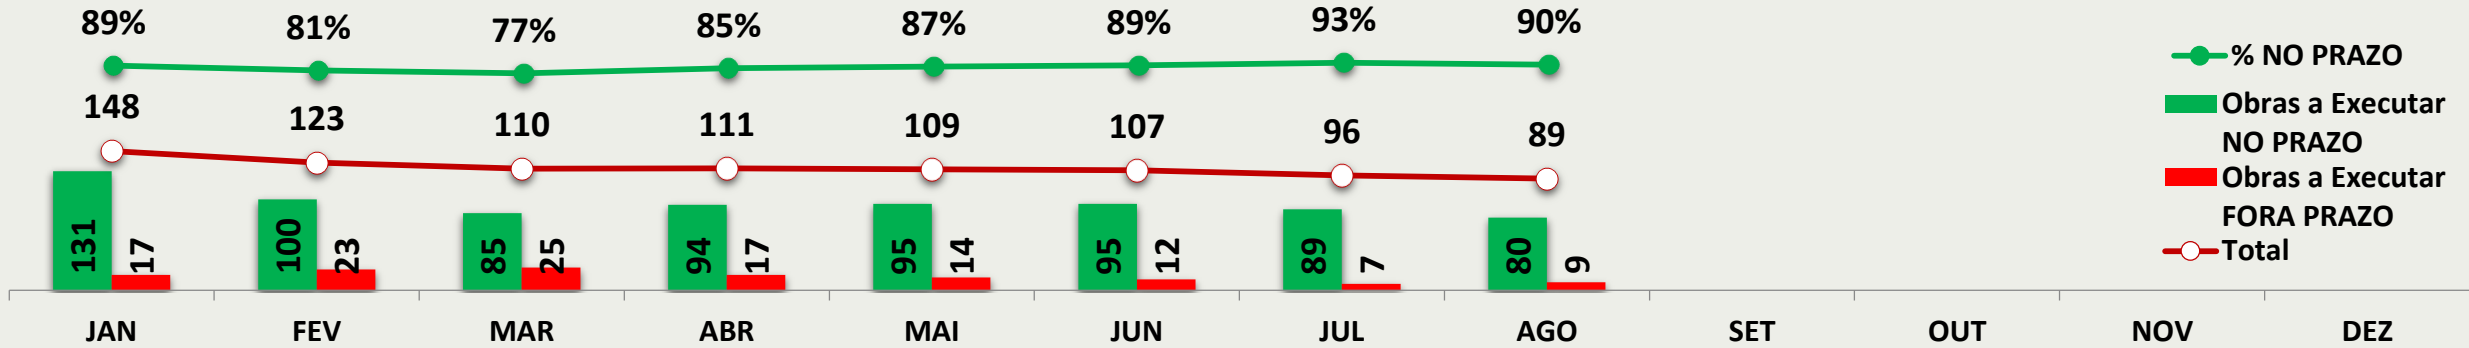

### Acompanhamento Estoque Novas Conexões Mensal Grupo B

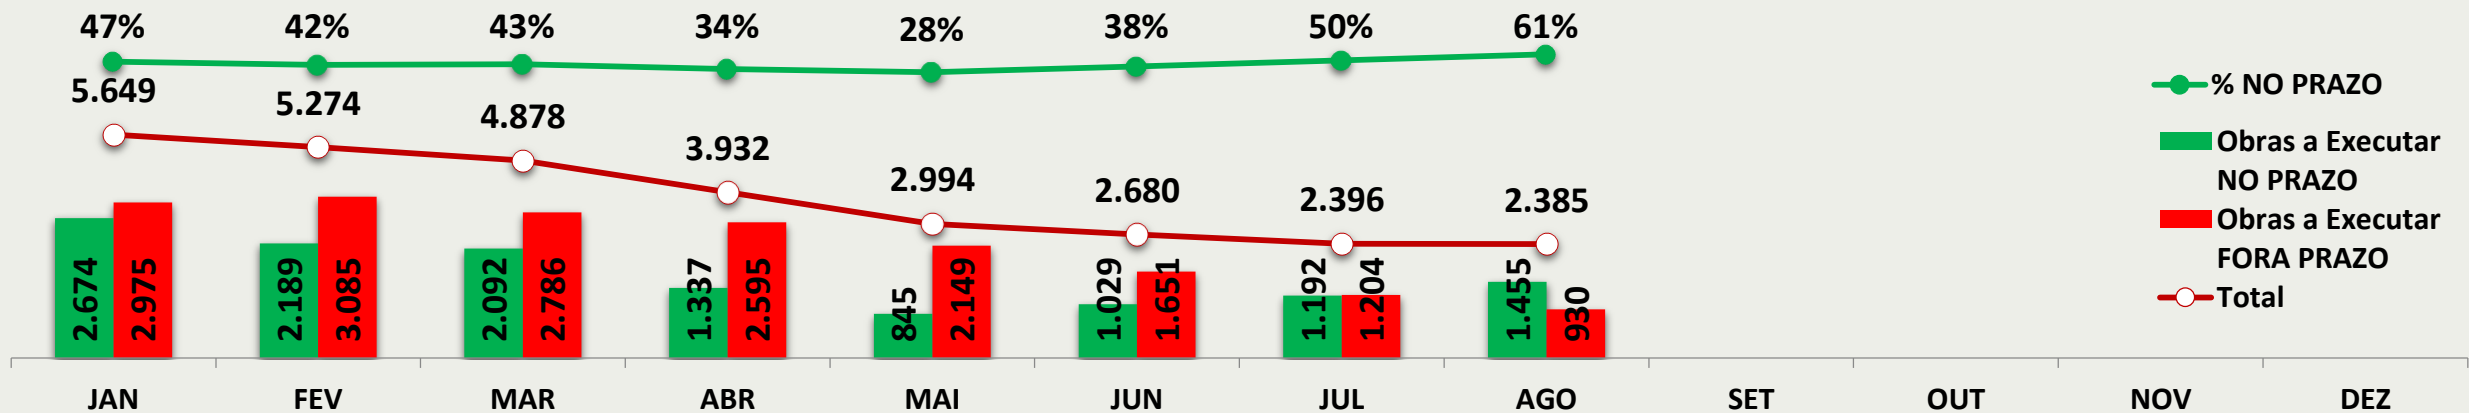





# Evolução da Execução Obras

Avanço Execução das Obras Cientes

Estoque  
Obras a Executar

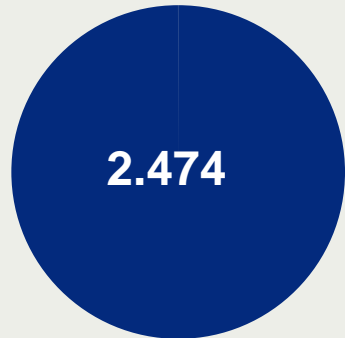


Obras em Estoque  
Prazo x Fora Prazo

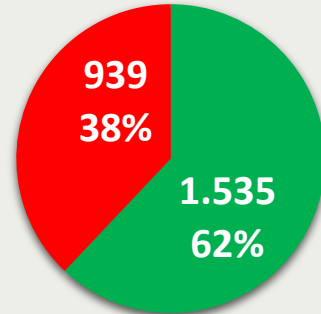


■ Obras a Executar NO PRAZO  
■ Obras a Executar FORA PRAZO

Dentro e Fora Prazo  
Grupo A

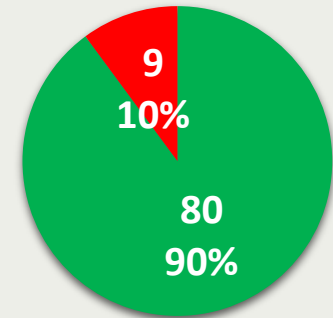

\*Total Grupo A: 89 Obras

Dentro e Fora Prazo  
Grupo B

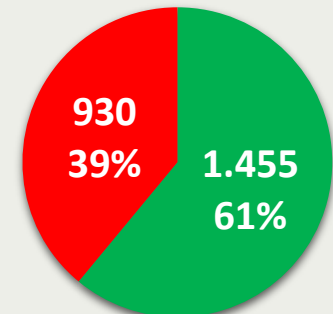

\*Total Grupo B: 2.385 Obras


# Mobilização das Turmas de Construção

Histórico de Mobilização



## Mobilização de Turmas 2020

Previsão Mobilizado Mobilizado

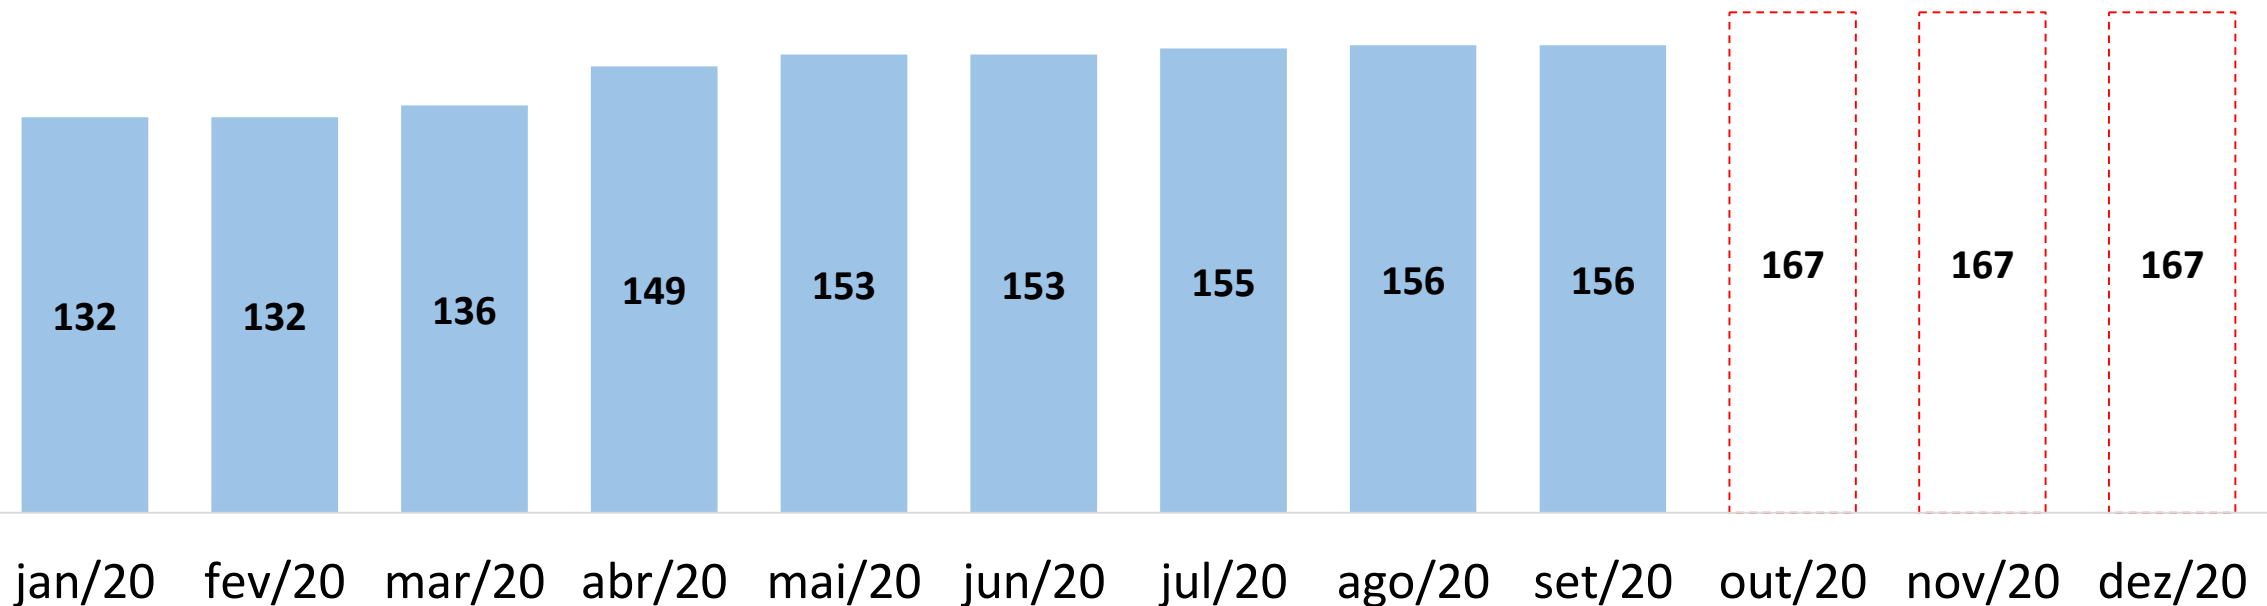



# OBRAS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE

Ações para atendimento às Unidades de Saúde



Foram realizadas um total de **65 obras** para atendimento às Unidades de Saúde no Estado do Ceará.




**Investimento Total MR\$ 3.594**  
**Participação ENEL MR\$ 1.975**



**65 Obras**



**47,61 km Rede**



**449 Postes**

Policlínica do Passaré



**Foram realizadas um total de 65 Obras para atendimento às Unidades de Saúde do Ceará. Executamos recentemente as obras para atendimento ao Posto de Saúde Carlos Ribeiro em Fortaleza e a Policlínica do Passaré.**



**Obrigado**

