




Reunião Conselho de Consumidores







Novas Conexões – Fecham. Maio 2017

Histórico Anual de Obras / Clientes

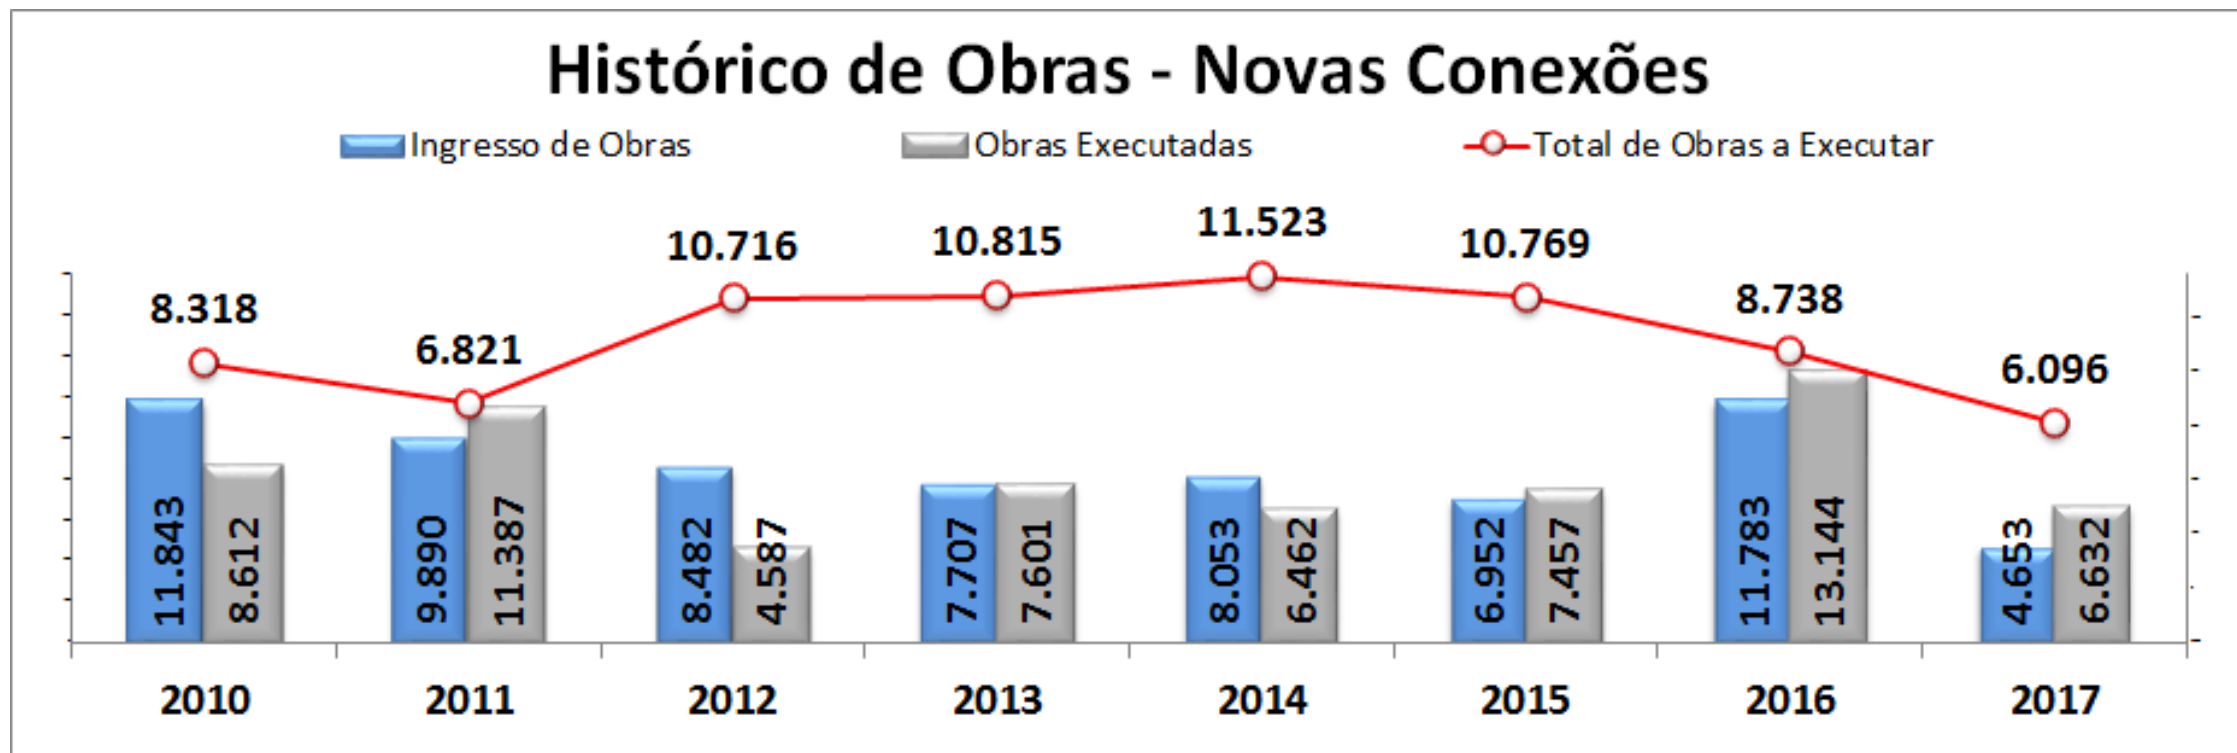

Novas Conexões 2017



Evolução Mensal do Estoque de Obras

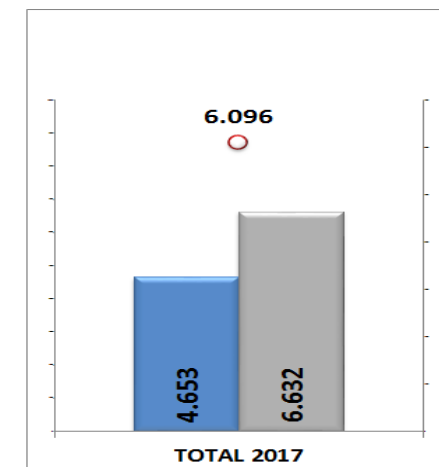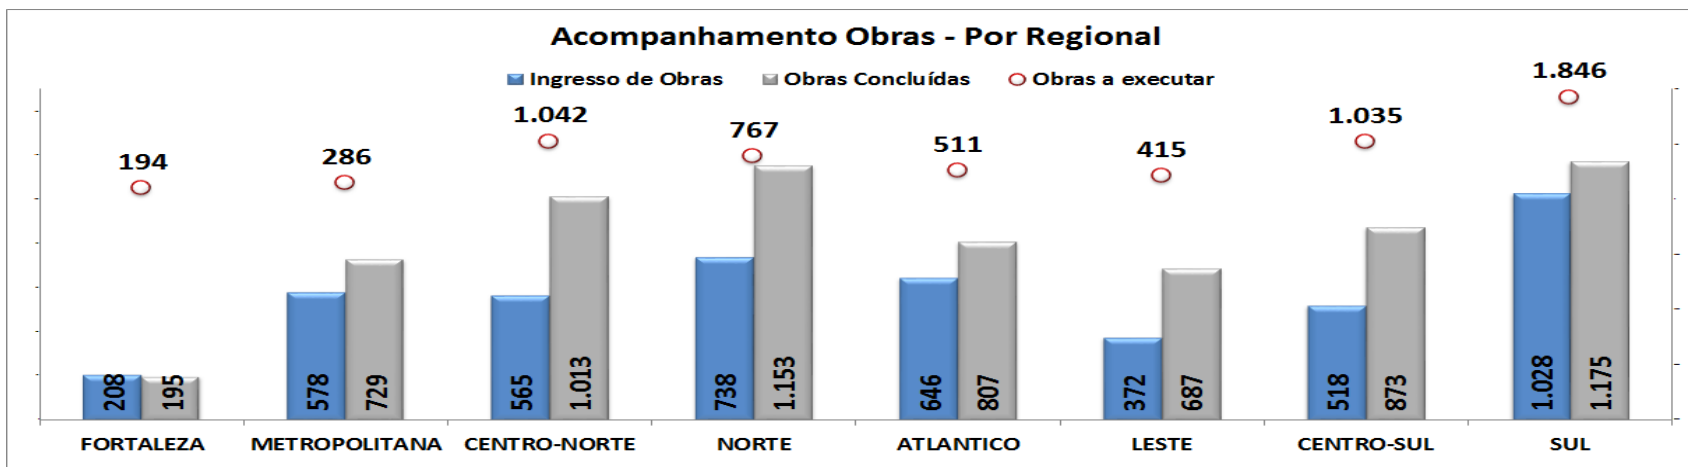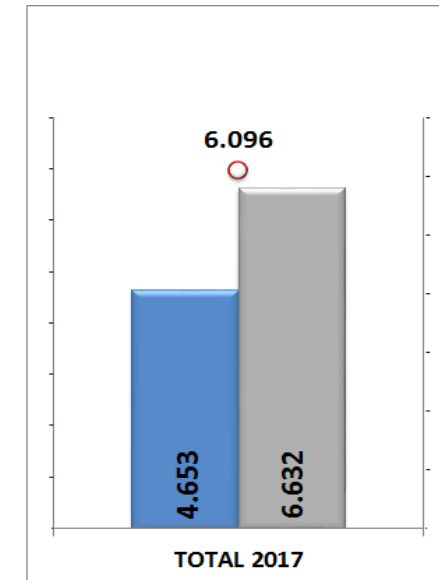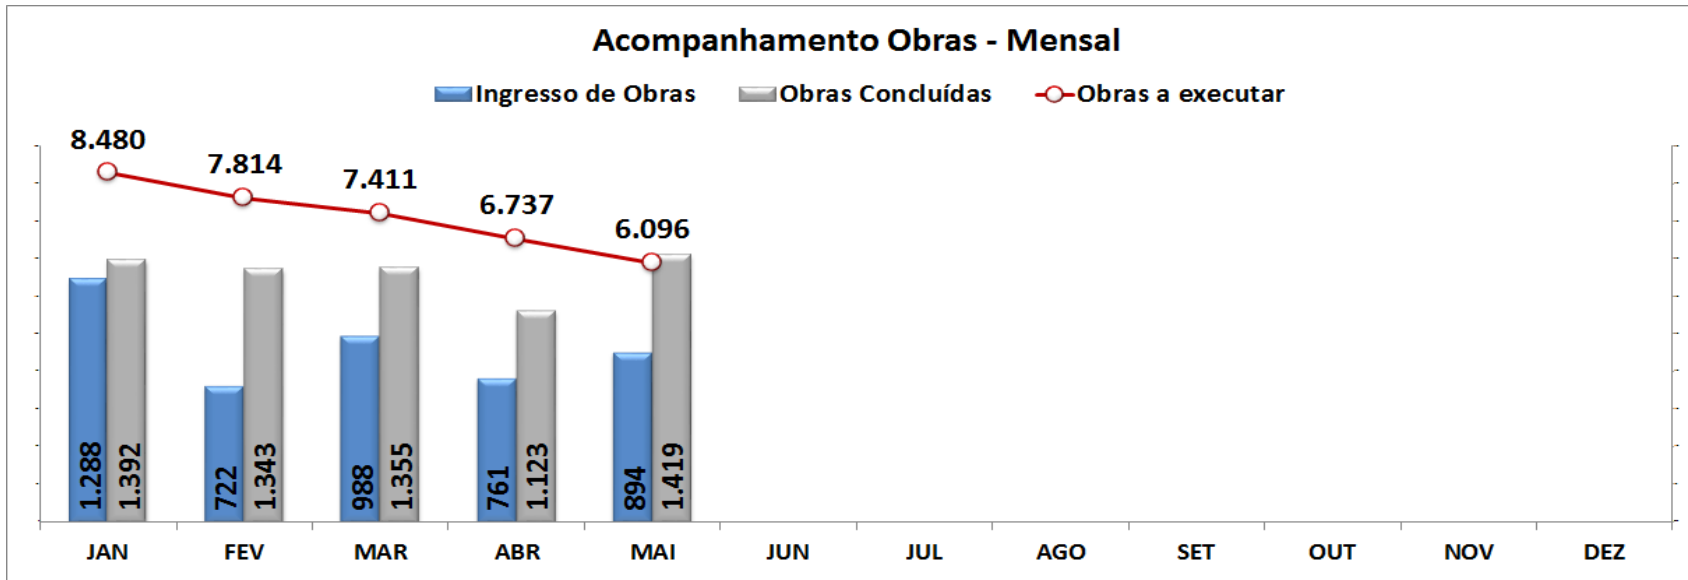


Estoque de Obras 2017

Fechamento Maio


Total de Obras: 6.096

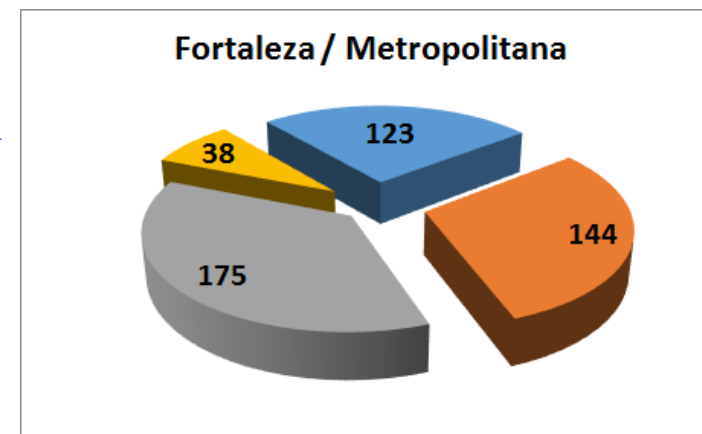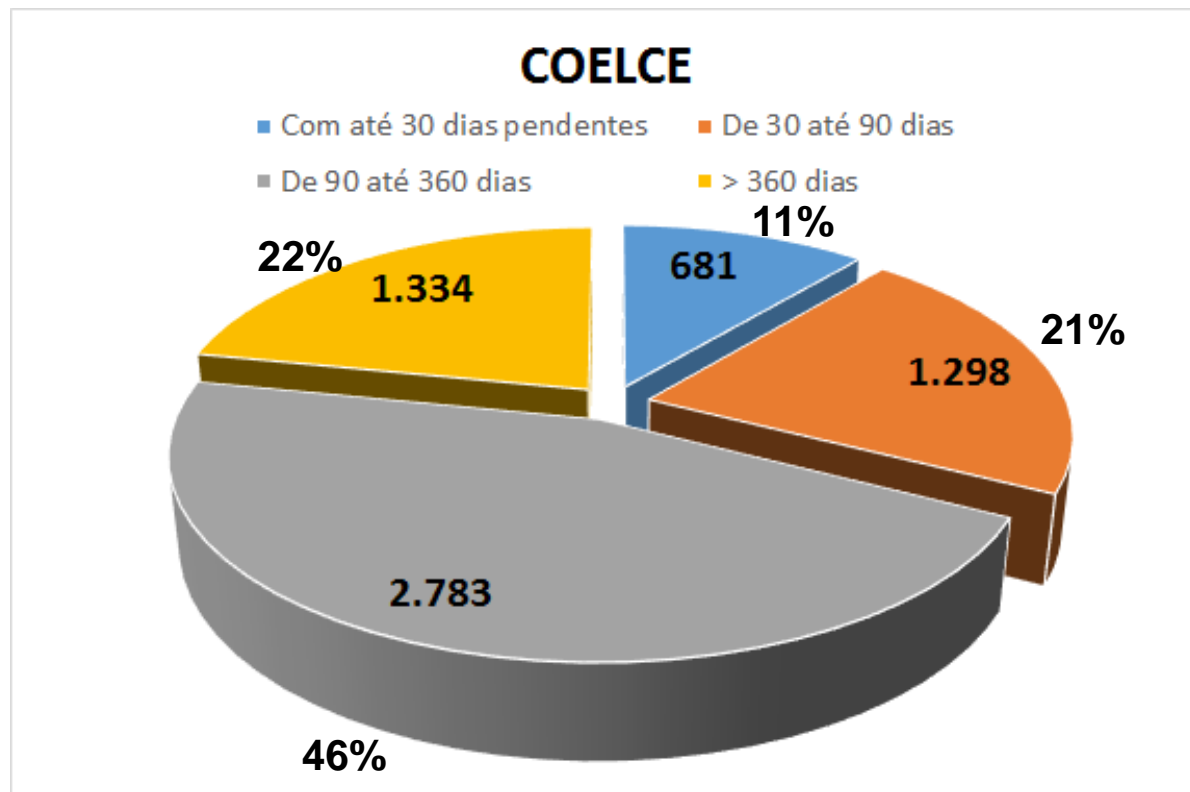

Total: 480
8%

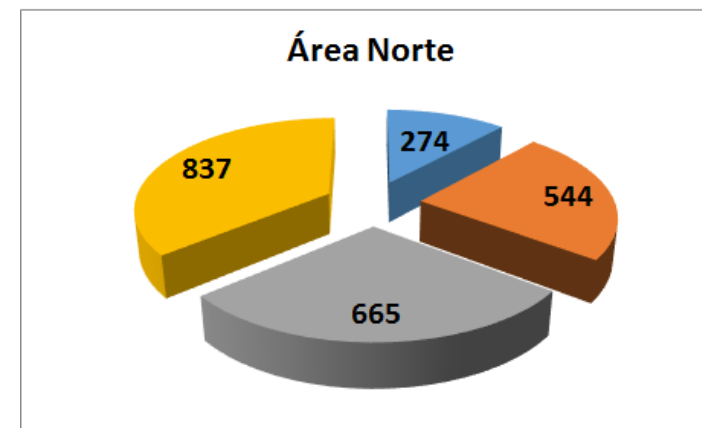


Total: 2320
38%

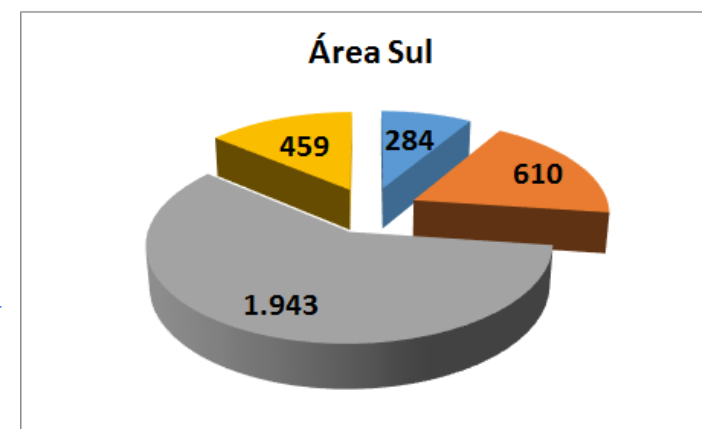


Total: 3296
54%

Set. 2013 X Estoque Maio 2017

Evolução da Redução: 92% -> 95%


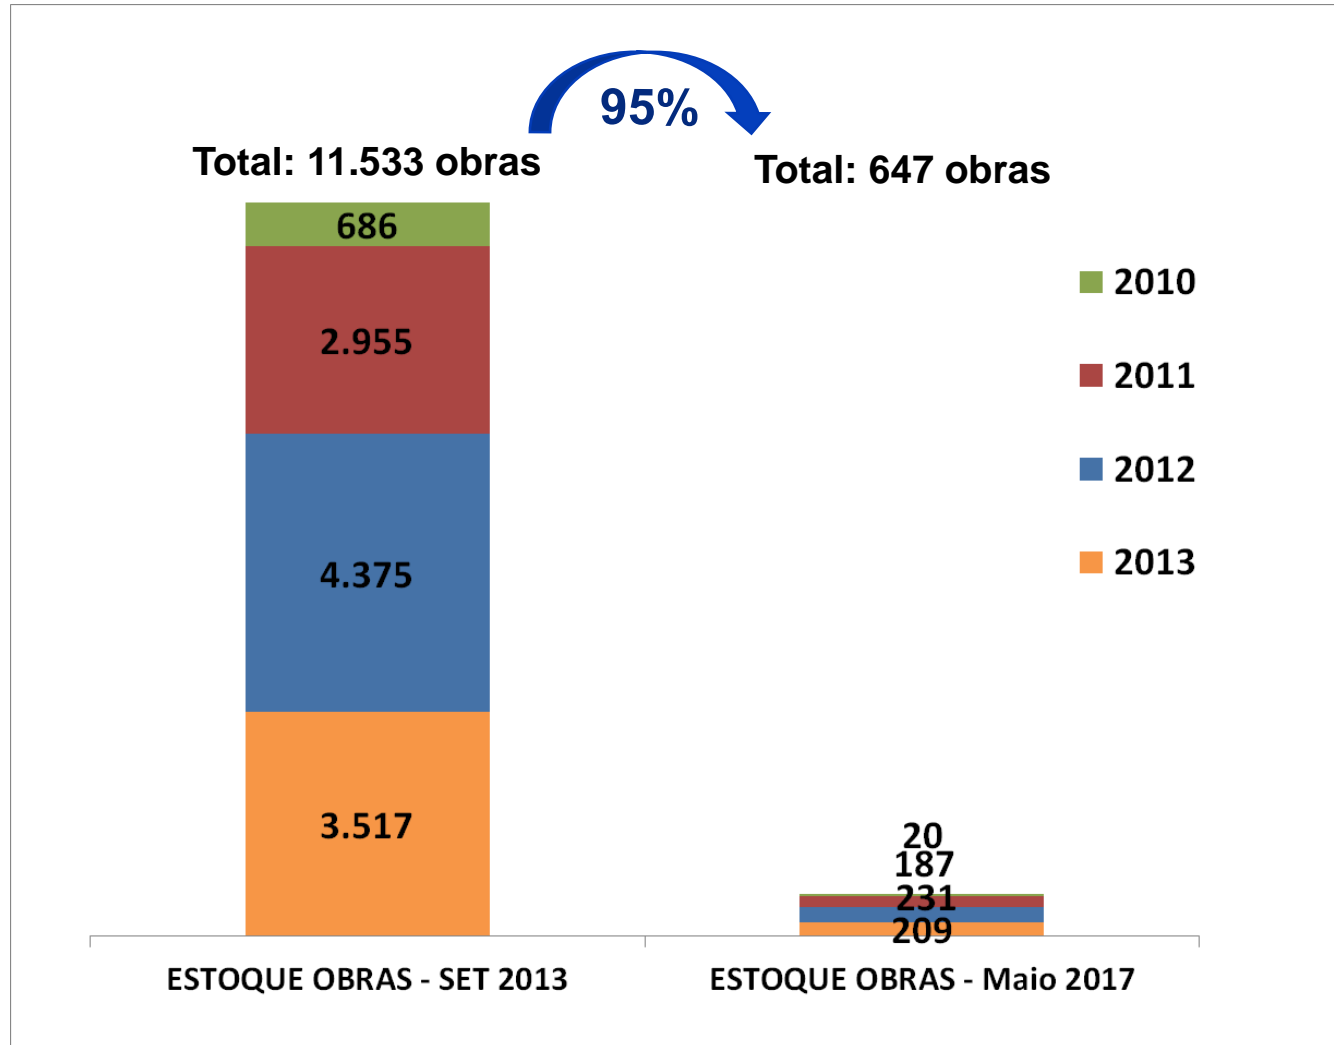


Mobilização de Equipes – Previsão Junho/17

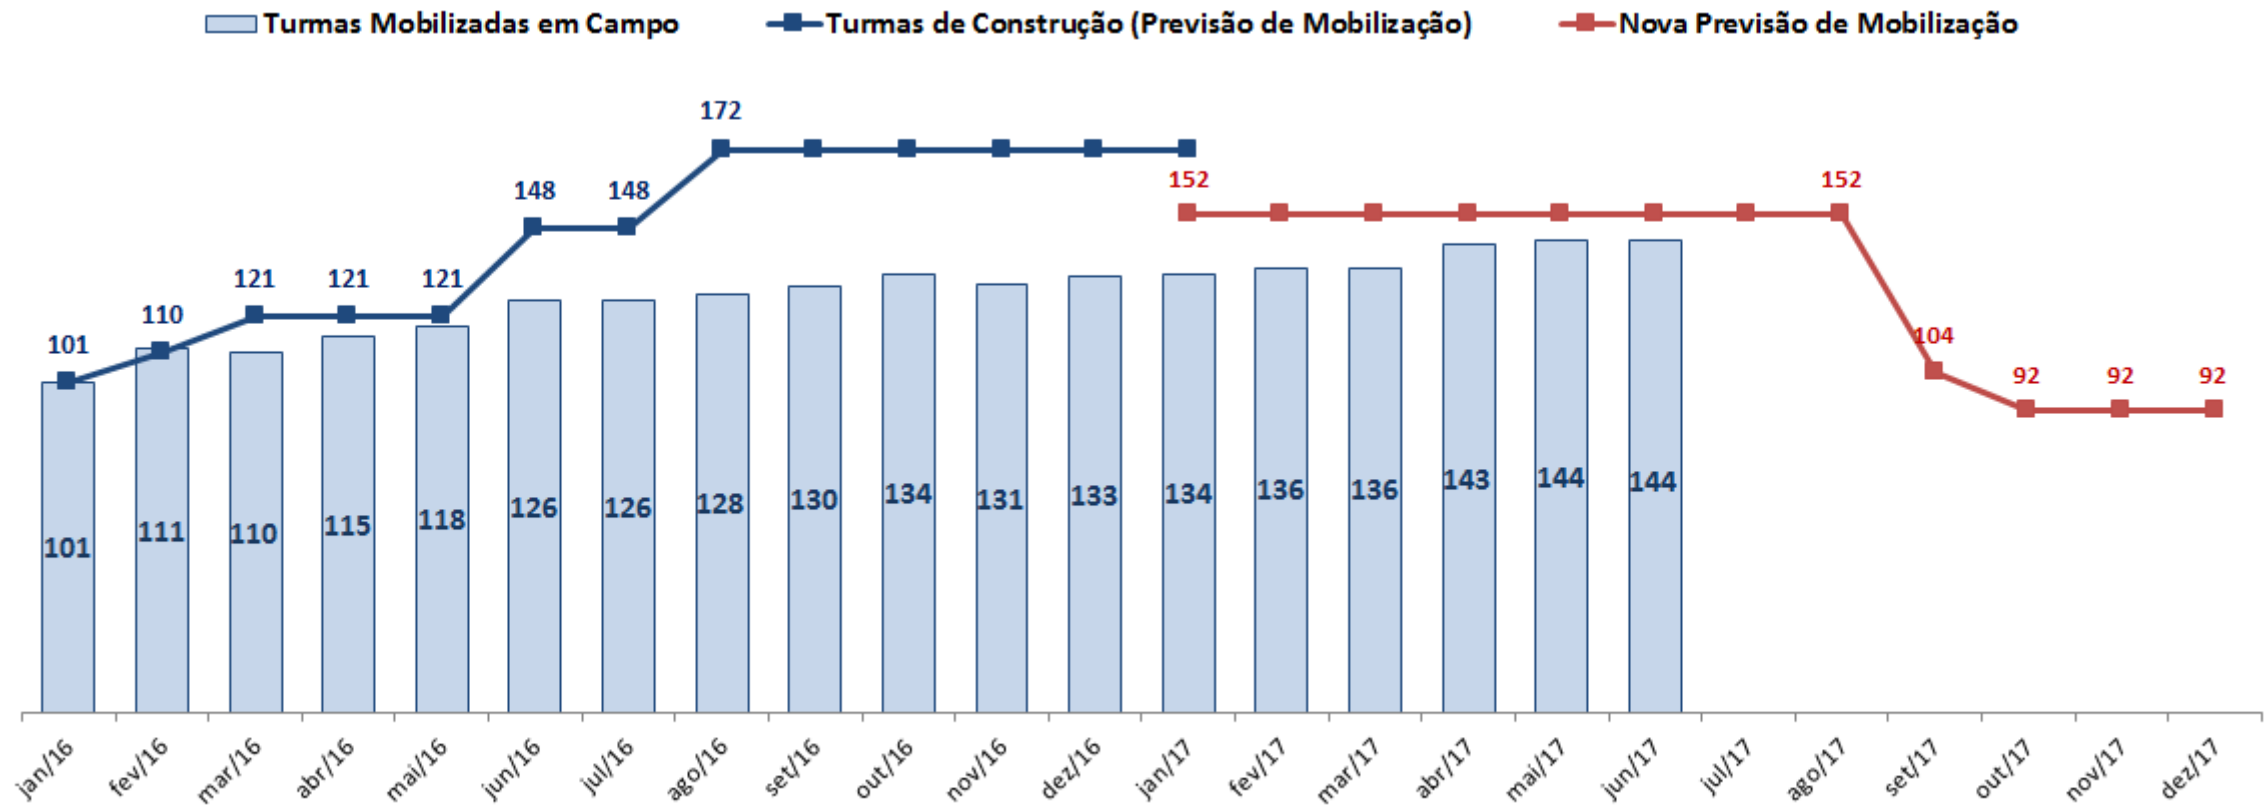


Ligação Nova com Obra - Enel Distribuição Ceará

Conquistas 2016 – Cumprimento dos marcos alinhados com Aneel e ARCE (estoque)

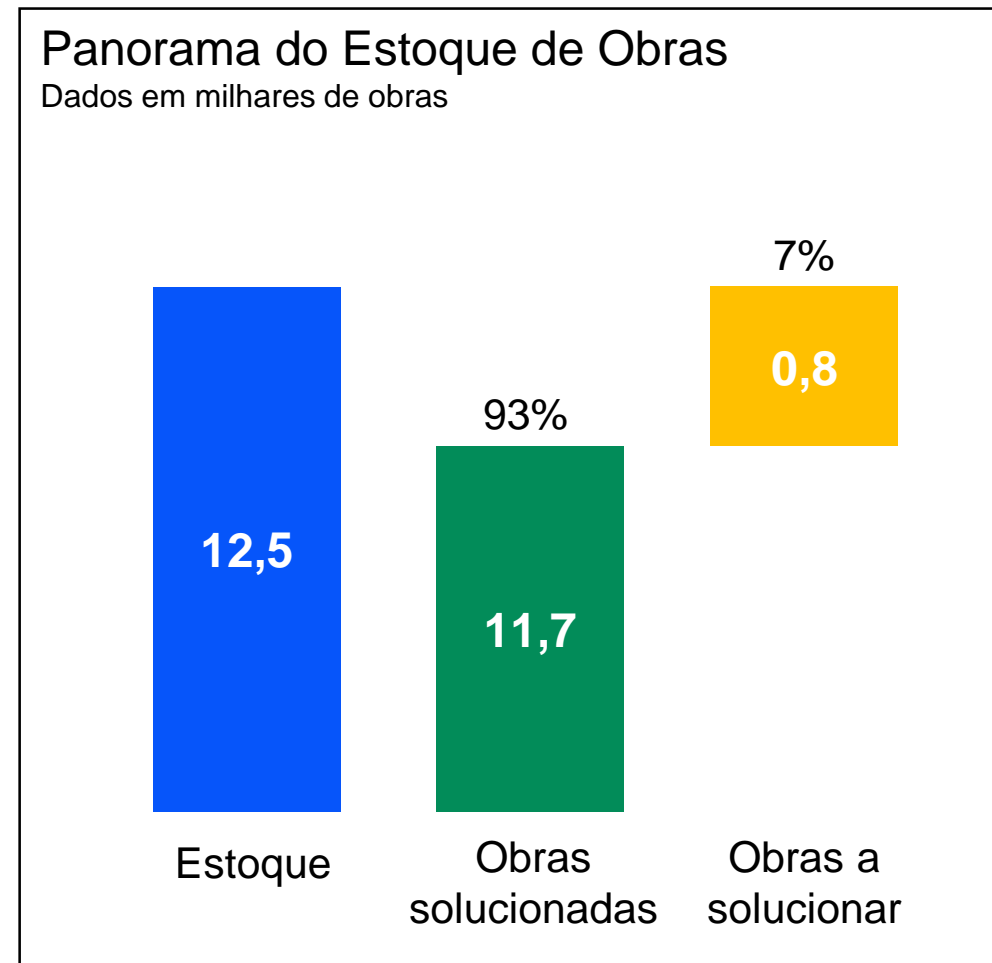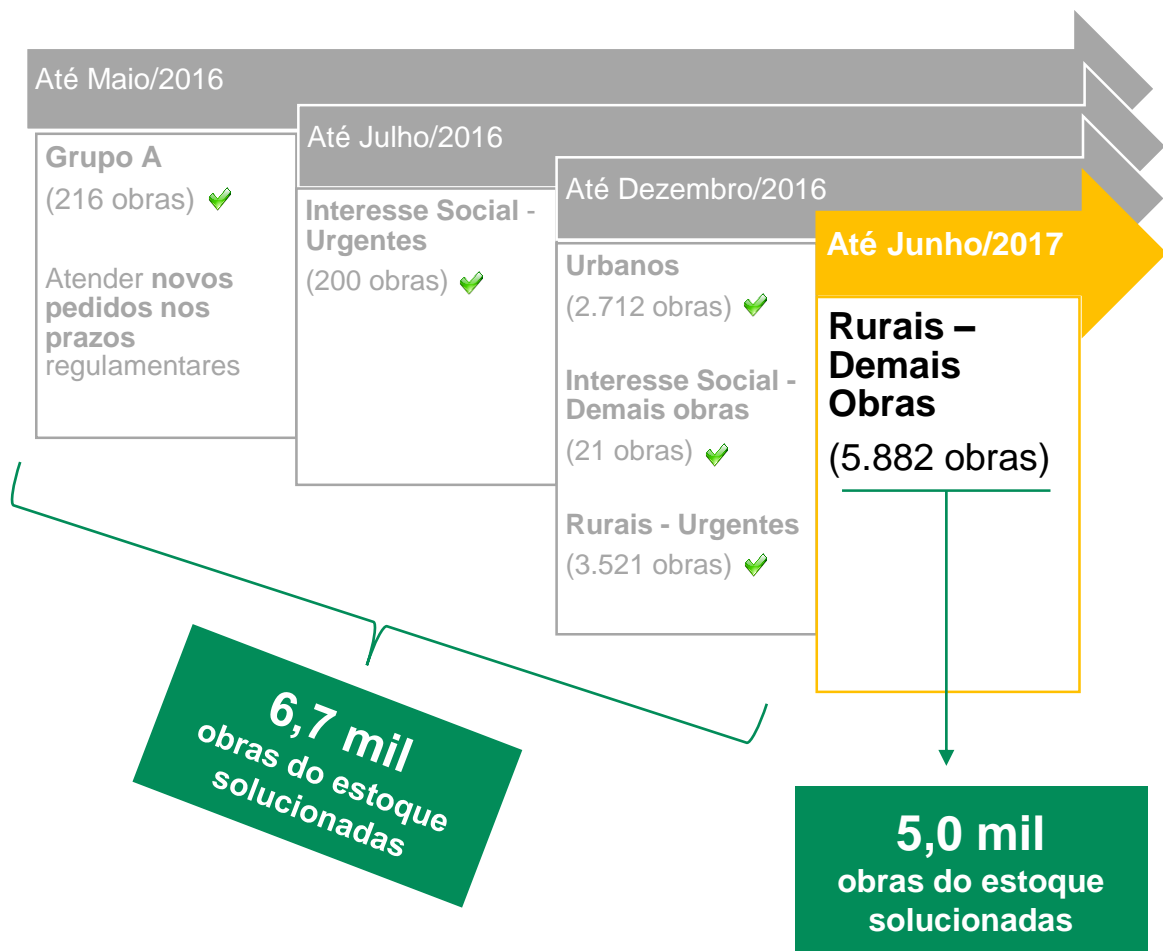


Estoque: Realizado 2016/2017

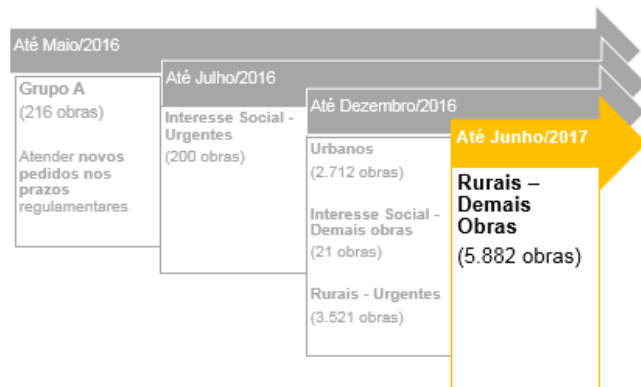

- Estamos com estrutura adequada para executar as obras do Plano até o final de Junho/17.

Obras Rurais Demais Obras- Planejado X Realizado

■ PREVISTO ■ REALIZADO ■ OBRAS CANCELADAS ■ PENDÊNCIA DO CLIENTE

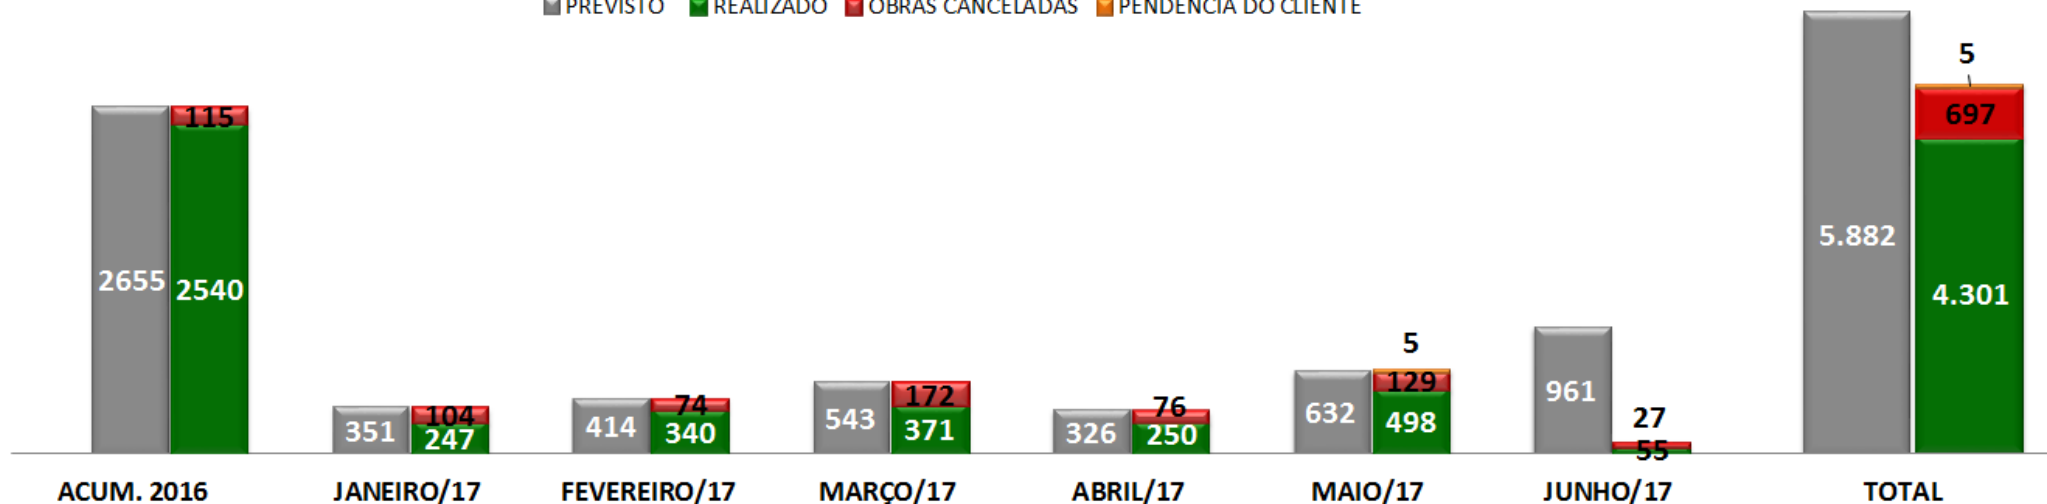

**Avanço:
85%**

Fluxo: a partir de maio de 2016




Solicitações Obras

Fluxo



TOTALACUM. 2017

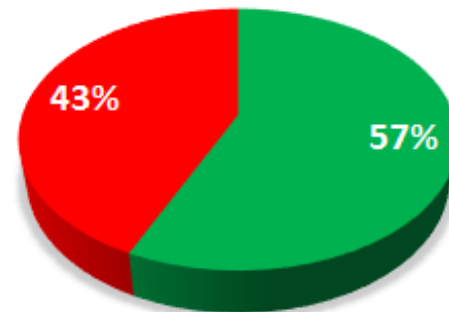

■ NO PRAZO
■ FORA DO PRAZO

Impactos no Fluxo de Obras

- Aumento de 30% do fluxo de novos ingressos em relação ao fluxo histórico dos últimos dois anos, (base 2016 que foi 30% maior que a media 2013 - 2015)
- Redução de 32% da Produtividade das turmas em relação ao previsto devido as chuvas;
- Priorização das Obras de interesse social (Adutoras de Abastecimento de Água).


▪ Ações :

- Acréscimo das Turmas de Linha Viva;
- Redistribuição das turmas de Construção nos Regionais com maior demanda;
- Aumento da produtividade de **12** obras/turma para **15** obras/turma /mês e de **60** pst/mês para **75** pst/mês por turma.



Fluxo

10.745 Obras solicitadas a partir de Maio/16 até 29/05/17

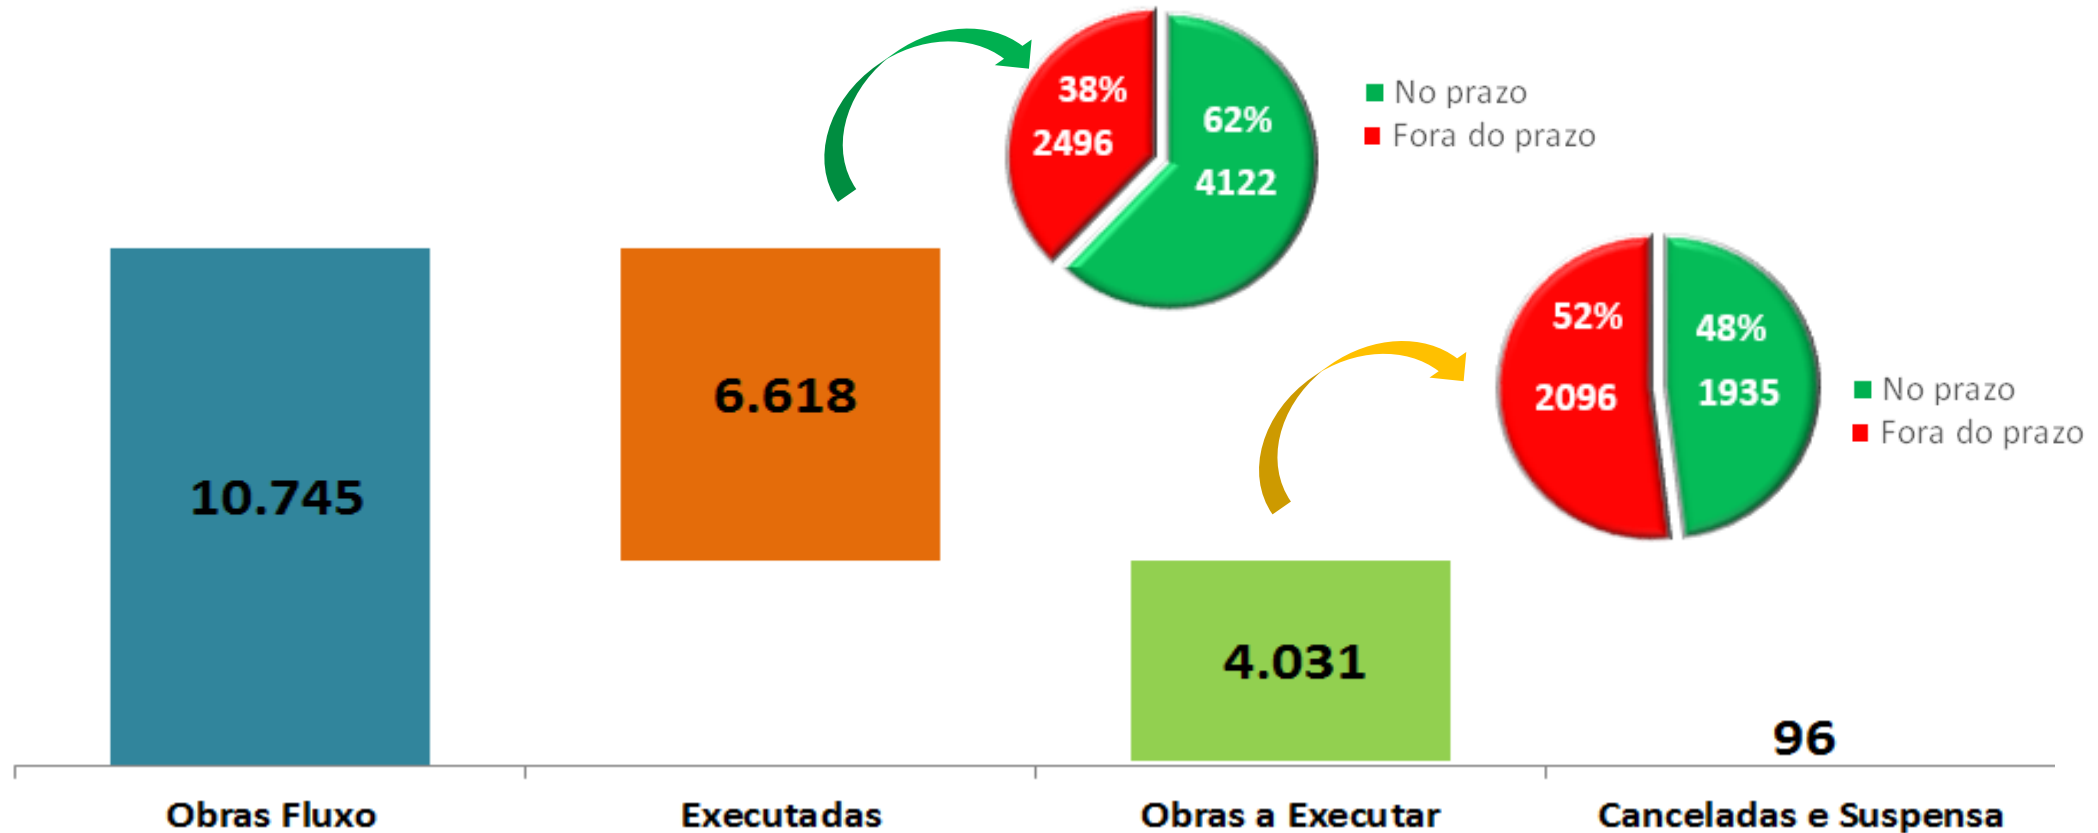





Fluxo

10.745 Obras solicitadas a partir de Maio/16 até 16/05/17
Intervalos de Tempo da Perda de Prazo


☐ Obras Executadas

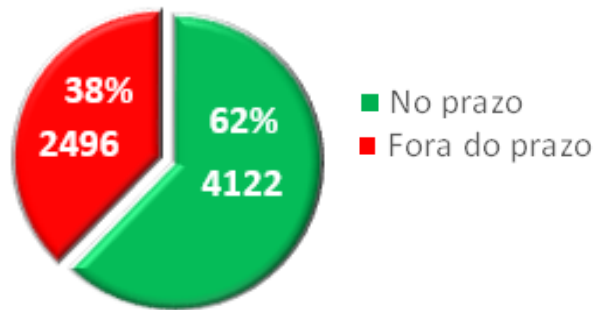


Obras Executadas Fora do Prazo

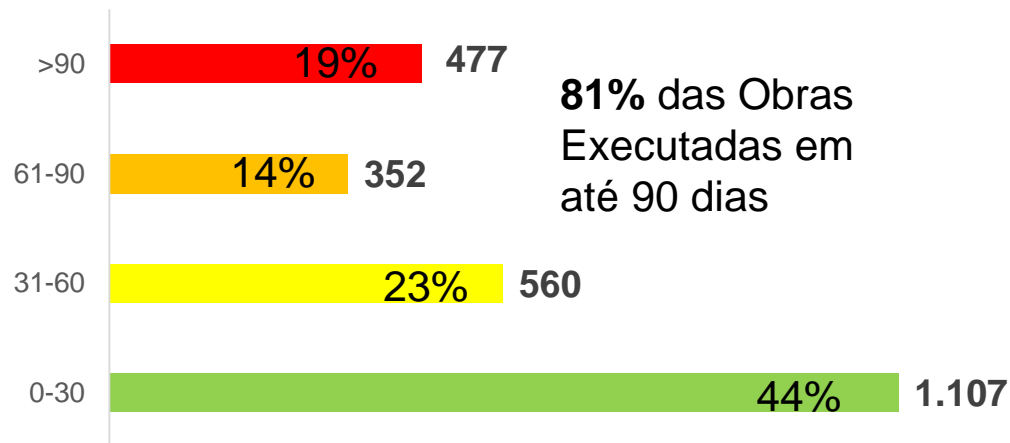

☐ Obras Pendentes de Execução

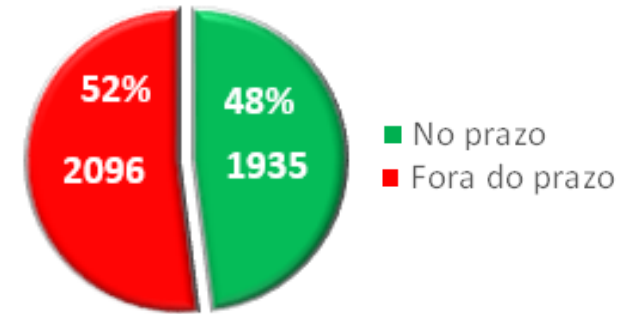

Obras Pendentes de Execução Fora do Prazo

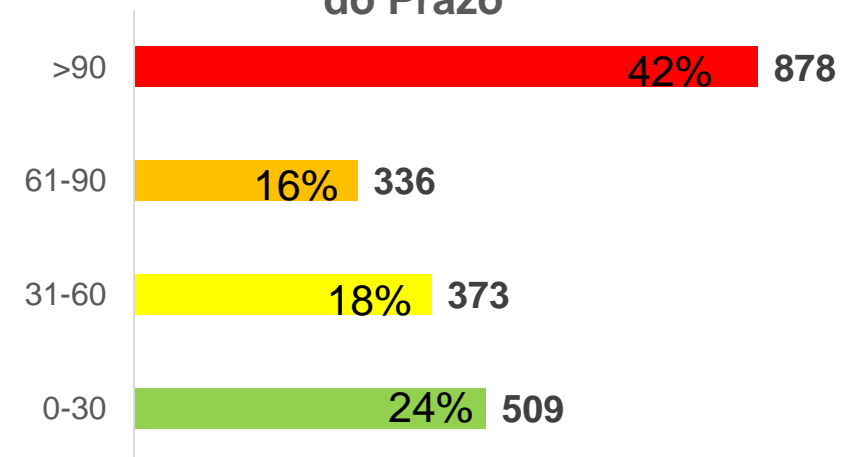

Próximos Passos



- Manutenção da quantidade de turmas visando regularizar prazos de atendimento conforme apresentado, Plano de Melhorias Enel Distribuição Ceará.

Obrigado!

